

काठमाडौं महानगरपालिका
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
आ.व. २०८२/०८३ को एकीकृत वार्षिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्दै जनमुखी तथा सहभागितात्मक विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न महानगरपालिकामा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले विकास आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा महानगरपालिका भित्र सञ्चालन भएका आयोजनाको गुणस्तर, प्रगति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता एवं जबाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका विविध औजारहरू मध्ये अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील औजार मानिन्छ । यसले स्थानीय सरकारद्वारा विनियोजित बजेटको उचित उपयोग भएको छ वा छैन भनी वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउ्न, आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयनको समयमा आइपर्ने अवरोधलाई सहजीकरण गर्ने गर्दछ । स्थानीय सरकारद्वारा विनियोजित सार्वजनिक स्रोत साधनको उचित उपयोग, योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति थाहा पाउन, समस्या भएमा सोको समाधानका लागि आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गरी निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न, गराउन भूमिका खेल्न र नागरिकले अनुभूत गर्ने प्रत्यक्ष प्रभावबारे जानकारी लिन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एक महत्वपूर्ण विधि मानिन्छ । अनुगमनमा लगानी अर्थात् स्रोत साधनको



प्रवाह समुचित रूपमा भएको छु की छैन, निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम क्रियाकलाप भएको छु की छैन, तोकिएको समयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छु की छैन र योजना वातावरणमैत्री एवं गुणस्तरीय भएको छु वा छैन लगायतका विषयको परिधिभिन्न रहेर परियोजना हेरिने एक व्यवस्थापकीय विधि हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको नीति, कानुन, आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालित योजना, आयोजना र परियोजनाको अनुगमन सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छु । ऐजन कानुनी व्यवस्था बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भई कार्य सम्पादन हुँदै आएको छु । उक्त कार्यविधि बमोजिम मूल्याङ्कन सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवालयको रूपमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले कार्य गर्दै आएको छु । ऐजन कार्यविधिले महानगरपालिकाबाट सञ्चालित १० लाख भन्दा बढी लागत भएको योजनाको सम्झौता भएपछि अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु भने एकाइले सम्बद्ध विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक बनाउनुपर्ने उल्लेख छु । यही व्यवस्थाबमोजिम एकाइले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक बनाइ अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्दै आएको छु ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट सबै विषयगत विभागलाई समेट्ने गरि अनुगमन कार्यलाई अझ नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले तीन वटा अनुगमन टोलीहरू गठन गरी अनुगमनका कार्यहरू भएका छन् । अनुगमनका क्रममा परियोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया, सम्वादका माध्यमबाट परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्य हुँदै आएका छन् ।

२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुने उल्लेख गरेको छु । उक्त समितिमा देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छु:



उपप्रमुख	—संयोजक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	—सदस्य
प्रमुखले तोकेको एक जना महिलासहित कार्यपालिका सदस्य दुई जना	—सदस्य
सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख	—सदस्य
कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख	—सदस्य
योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ प्रमुख	—सदस्य-सचिव

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ को दफा ४ मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार विभिन्न १२ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ भने अनुगमनका १३ वटा क्षेत्रहरू वर्गीकरण गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीमध्ये संयोजकको निर्देशानुसार सदस्यहरूको अनुकूलता र समय उपलब्धता भएअनुसार विभिन्न आयोजनामा सबै सदस्यहरू सम्मिलित भई अनुगमन कार्य सम्पन्न हुँदै आएको छन् । संयोजक र सदस्य-सचिवको अनिवार्य उपस्थितिमा अन्य सदस्यको अनुकूलताअनुसार अनुगमन कार्य सम्पन्न भएका छन् । अनुगमनको क्रममा पूर्वाधार विज्ञको रूपमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विज्ञ सदस्य, परियोजना कार्यान्वयनस्थल रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरू र नगर प्रहरी समेतको सहभागिता रहने गरेको छ ।

३. अनुगमन टोली

काठमाडौँ महानगरपालिका अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न कार्यव्यवस्था एवं विविध कारणले सम्भव नहुने भएकोले नियमित तथा आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्न तीन वटा अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन कार्य हुँदै आएका छन् । अनुगमन टोलीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हो । टोलीलाई अनुगमन कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइबाट हुँदै आएको छ । अनुगमन टोलीलाई



परियोजना अनुगमनको क्रममा कुनै अस्पष्टता भएमा सोको सहजीकरणका लागि एकाइले त्यस्ता विषयमा सहजीकरण गर्ने र सोको जानकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसमक्ष गराउने गर्दछ । अनुगमन सम्बन्धित कार्य गर्न गठित अनुगमन टोली देहायबमोजिम रहेका छन्:

(क) सुशासन तथा सामाजिक विकास अनुगमन टोली:

सुशासन तथा सामाजिक विकास अनुगमन टोलीको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:


- १ प्रशासन विभाग,
- २ सामाजिक विकास विभाग,
- ३ सूचना प्रविधि विभाग,
- ४ शिक्षा विभाग,
- ५ योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ,
- ६ सहरी योजना आयोग,
- ७ स्वास्थ्य विभाग,
- ८ सहरी व्यवस्थापन विभाग,
- ९ कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग,
- १० सम्पदा तथा पर्यटन विभाग (भौतिक पूर्वाधार बाहेक) र
- ११ वडा कार्यालय ।

सुशासन तथा सामाजिक विकास अनुगमन टोलीमा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरू रहेका छन्:

- १ डा. श्री सुरज काफ्ले, विज्ञ सदस्य, सहरी योजना आयोग
- २ श्री सुदर्शन भट्टराई, वरिष्ठ शाखा अधिकृत, राष्ट्रिय सभागृह
- ३ श्री बिन्जु बज्रचार्य, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ
- ४ श्री उत्तम अमात्य, लेखा अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाई
- ५ श्री तोइन्द्र राज सापकोटा, लेखा अधिकृत, शिक्षा विभाग

(ख) विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोली:

विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोलीको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:



- १ विपद व्यवस्थापन विभाग,
- २ वातावरण व्यवस्थापन विभाग,
- ३ उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र
- ४ वडा कार्यालय

विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोलीमा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरु रहेका छन्:

- १ श्री प्रशुनरत्न बज्राचार्य, विज्ञ सदस्य, सहरी योजना आयोग
- २ श्री सीता शर्मा, वरिष्ठ शाखा अधिकृत, राष्ट्रिय सभागृह
- ३ श्री नलि बज्राचार्य, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य विभाग
- ४ श्री माधव काफ्ले, वरिष्ठ इन्जिनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग
- ५ श्री जगन्नाथ शर्मा पौडेल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, राजस्व विभाग

(ग) सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन टोली:

सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन टोलीको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः

- १ सम्पदा तथा पर्यटन विभाग,
- २ सार्वजनिक निर्माण विभाग र
- ३ वडा कार्यालय

सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन टोलीमा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरु रहेका छन्:

- १ आ.इ. श्री बाबुराम भट्टराई, विज्ञ सदस्य, सहरी योजना आयोग
- २ श्री रविन्द्र रिजाल, वरिष्ठ इन्जिनियर, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग
- ३ श्री जीवन रेग्मी, वरिष्ठ इन्जिनियर, सहरी व्यवस्थापन विभाग
- ४ श्री जानकी मैनी सिंह, वरिष्ठ शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास विभाग
- ५ श्री विकास ओझा, सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना प्रविधि विभाग

४. अनुगमन विधि र सङ्ख्या

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजकको कार्य व्यस्थतालाई मध्यनजर गर्नुका साथै अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन प्रत्येक हप्ताको



बिहीबार र आकस्मिक रुपमा जहिलेसुकै योजनाहरुको स्थलगत अनुगमनमा जाने गरी कार्यतालिका तयार गरी सोहीबमोजिम अनुगमनका कार्यहरु हुँदै आएका छन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु अनुगमनमा जानु पूर्व परियोजना कार्यान्वयन सम्बद्ध विभागसँग कागजात माग गरी अध्ययन गर्ने साथै सम्बद्ध विभागसँग जानकारी समेत लिने गरिएको छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजकको नेतृत्वमा फिल्डमा गएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा जम्मा २७ (सत्ताइस) वटा परियोजनाहरुको अनुगमन गरेको हो । अनुगमन पश्चात योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइद्वारा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ । सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन टोलीले ६ वटा परियोजनाहरुको अनुगमन गरी जानकारी गराएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिद्वारा अनुगमन गरिएका परियोजनाहरुको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, स्थानीयबासी सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति रहने हुँदा परियोजना निर्माण सम्बन्धित विषयमा सरोकारवाला तथा स्थानीयबासीको भनाइ सुनी, सूचना तथा जानकारी लिई आवश्यकताबमोजिम कैफियत देखिएमा त्यसको तत्काल सुधारका लागि लिखित तथा मौखिक निर्देशन समेत दिने गरिएको छ । समितिसमक्ष कुनै तबरबाट परियोजना सम्बन्धित विषयमा गुनासो आएको अवस्थामा आवश्यक देखिएका बखत आकस्मिक रुपमा पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने साथै सम्बन्धित पक्षलाई सम्पर्क गरी परियोजनाको विषयमा जाँचबुझ गर्ने तथा निर्देशन समेत दिने र परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध आएको अवस्थामा त्यसको सहजीकरण समेत गर्ने गरिएको छ । समितिको अनुगमन सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन एकाइबाट हुँदै आएको छ ।

५. वडास्तरीय अनुगमन समिति

काठमाडौँ महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ को दफा ५ मा वडास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था रहेको छ । महानगरपालिकाबाट वडा क्षेत्रभित्र



सञ्चालित विकास योजनाहरूको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन वडा तहबाट हुने उल्लेख छ । सो व्यवस्था बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूमा वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन भइ समितिबाट अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू हुँदै आएका छन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधिले प्रत्येक वडामा देहायबमोजिमको वडास्तरीय अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरेको छः

- | | |
|---|-------------|
| (क) वडा समितिले तोकेको नियमनसम्बन्धी कार्य हेर्ने वडा सदस्य | —संयोजक |
| (ख) वडामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी | —सदस्य |
| (ग) वडा समितिले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ | —सदस्य |
| (घ) वडा सचिवले तोकेको कर्मचारी | —सदस्य-सचिव |

काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूमा वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन भइ अनुगमन कार्य हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वडास्तरीय अनुगमन समितिबाट वडागत रूपमा प्राप्त विवरण अनुगसार अनुगमन तथा मूल्यांकन सङ्ख्या जम्मा ३९२ रहेको छ ।

६. काठमाडौँ महानगरपालिकाका केन्द्रीय प्रशासनिक एकाइहरूबाट भएको अनुगमन सम्बन्धी विवरण-

काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत रूपमा विभिन्न प्रशासनिक एकाइहरूबाट पनि योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।

१. राजस्व सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागबाट राजस्व सम्बन्धी विषयमा तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन गर्नको लागि विभिन्न अनुगमन टोलीहरू र इन्टर्नहरू परिचालन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजस्व विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार २४ वटा वडाहरूको जम्मा २९,९४९ वटा तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन भएका छन् ।

२. सहकारी सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागबाट सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सहकारी



विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा ४० वटा सहकारीहरुको अनुगमन भएका छन् ।

३. कृषि सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट बजारको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा २६३ वटा योजनाहरुको अनुगमन भएका छन् ।


४. सम्पदा तथा पर्यटन सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट सम्पदा तथा पर्यटन सम्बन्धी योजनाहरुको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा १५६ वटा योजनाहरुको अनुगमन भएका छन् ।

५. स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभाग मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा १५३ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन भएका छन् ।

६. सामाजिक विकास सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागबाट सामाजिक विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सामाजिक विकास विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा १४८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन भएका छन् ।

७. सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागबाट सार्वजनिक निर्माण तथा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सार्वजनिक निर्माण विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा ५५ वटा योजनाहरुको अनुगमन भएका छन् ।

८. उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन सम्बन्धी अनुगमन - काठमाडौँ महानगरपालिकाको उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाबाट उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन सम्बन्धी योजना तथा




कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा ५४ वटा योजनाहरूको अनुगमन भएका छन् ।

अनुगमनको सारांश विवरण -

क्र सं	समिति /टोली	अनुगमन संख्या	कैफियत
१	अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति	२७	
२	अनुगमन टोली	६	
	जम्मा संख्या	३३	

विभागगत अनुगमनको विवरण -


क्र सं	विभागको नाम	अनुगमन भएको संख्या	कैफियत
१	राजस्व विभाग	२९,९४१	तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन
२	सहकारी विभाग	४०	
३	कृषि तथा पशुपन्छी विभाग	२६३	
४	स्वास्थ्य विभाग	१५३	
५	सम्पदा तथा पर्यटन विभाग	१५६	
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५५	
७	सामाजिक विकास विभाग	१४८	
८	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजना	५४	
	जम्मा	३०,८१०	



वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट भएका अनुगमन सम्बन्धी विवरण -


क्र सं	वडा नम्बर	अनुगमन सङ्ख्या	कैफियत
१	२	६७	
२	४	२५	
३	५	५५	
४	७	६६	
५	१४	५६	
६	२६	४०	
७	२९	३२	
८	३१	५१	
	जम्मा	३९२	

काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, अनुगमन टोली, विभिन्न विभागहरु र वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै संयन्त्र मार्फत भएका अनुगमन तथा मूल्यांकनको कुल सङ्ख्या ३९,२३५ रहेको छ ।




अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा गरिएका अनुगमनसम्बन्धी विवरण देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
१	हनुमान ढोका ढुंगा छाप्ने कार्य	२४	१६ करोड ७३ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँ ३८ पैसा	२०८२।४।४	वातावरणमैत्री निर्माण कार्यका लागि जोड दिँदै जमिनमुनीको पानीको स्रोत र मात्रा घटेको अवस्थामा पुनर्सिँञ्चित तथा पुनर्भरणका लागि रिचार्ज पिट/सोक पिट राख्ने पहल गर्नु पर्ने ।
२	धुलो रहित सडक पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत फलफूल बजारमा सडक ढलान गर्ने कार्य	१४	७४ करोड ९९ लाख ९८ हजार ७ सय ५१ रुपैया २० पैसा (भ्याट कन्टिन्जेन्सी पिएस सहित)	२०८२/६/२७	निर्माण कार्य क्षेत्रमा जथाभावी फालिएको फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि वातावरण व्यवस्थापन विभागसँग योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइले समन्वय गर्ने ।



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
३	जूद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रचलिकरण कार्य	२३	९४ लाख ९६ हजार ८९ रुपैया ७५ पैसा (भ्याट सहित)	२०८२/८/४	
४	Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC परियोजना - १	२,३, १४, १६, १९, २६ र ३० का विभिन्न स्थान	१ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याटसहित)	२०८२/८/४	१. योजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँहरूमा तत्काल प्रेशर टेष्ट गर्ने, २. परियोजना सम्पन्न भए पछि pressure test गरेर मात्र परियोजना बुझिलिने । ३. सम्पन्न परियोजनाको सावधिक रूपमा नियमित परिक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि सम्बन्धित विभागले कार्ययोजना तयार गरी सो बमोजिम निर्देशन दिने ।




क्र सं	योजनाको नाम	बडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
५	Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC परियोजना -२	बडा नं. २३१४१६१९२६२३० का	१ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याटसहित)	२०८२/८/४	१. योजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँहरूमा तत्काल प्रेशर टेष्ट गर्ने, २. परियोजना सम्पन्न भए पछि pressure test गरेर मात्र परियोजना बुझिलिने । ३. सम्पन्न परियोजनाको सावधिक रूपमा नियमित परिक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि सम्बन्धित विभागले कार्ययोजना तयार गरी सो बमोजिम निर्देशन दिने ।
		विभिन्न स्थान			
६	Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk	२७	३ करोड ५२ लाख १६ हजार ४ सय ६० रुपैया ९ पैसा लागत (भ्याट सहित)	२०८२/८/११	१. भोटाहिटि क्षेत्रमा ढुङ्गा छाप्दा जमिन सतहमा Slop नमिलि अग्लो होचो भएर पैदल यात्रीलाई असहज भएको देखिएको र स्थानीय बासिन्दाको गुनासो समेत आएकोले यस परियोजना अन्तर्गतका त्यस्ता स्थानहरूमा



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
					तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको । २. परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न ठाँउहरूमा जमिनमुनीको पानी पुनर्भरणका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी पानी पुनर्भरण हुने व्यवस्था मिलाउने ।
७	भद्रकाली मन्दिर परिसर	१	३६ करोड १८ लाख १५ हजार २	२०८२/९/८	निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमानै परियोजना
	पुनर्निर्माण कार्य		सय ११ रुपैयाँ		सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
८	महाँकाल मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य	२२	१० करोड ३६ लाख ४६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ	२०८२/९/९	निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमानै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
९	खुल्लामञ्च मा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने कार्य	२८	६ करोड ९८ लाख ७० हजार ३ सय १५ रुपैयाँ	२०८२/९/९	खुल्ला मञ्चको खुल्ला मैदानमा उम्रिएको अनावश्यक झारपातले रोपिएको दुवोलाई अतिक्रमण गरेको देखिएकोले त्यसको गोडमेल तथा सरसफाइका लागि उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजनालाई निर्देशन बमोजिम आयोजनालाई पत्राचार गरिएको । निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
१०	धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र (वडा ६ १० ३१ र ३२)	३२	८० करोड २३ लाख ०३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ १९ पैसा	२०८२/९/१८	निर्माण कार्यको गुणस्तरमा सुनिश्चितता कायम गरी विचलित नभइकन कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित विभाग अगाडि बढ्नु पर्ने ।



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
११.	बागदरबार को रेट्रोफिटिङ्ग कार्य	११	रु. ७४ करोड ४७ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ १३ पैसा (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित)	२०८२/१०/२३	१. बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग गर्दा मौलिकता र संरचनागत बलियोपनालाई निर्माण कार्यको प्रारम्भदेखि हरेक प्रक्रियामा सार्वजनिक निर्माण विभागले निगरानी गर्ने । २. रेट्रोफिटिङ्ग कार्यमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने ।
१२.	Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)	१	४ करोड ६ लाख ८१ हजार ८० रुपैयाँ १४ पैसा (भ्याट र पिएस सहित)	२०८२/१०/२३	१. पोखरीमा सदावहार रूपमा पानीको सतह एकैनाशको कायम रहिरहने व्यवस्थाका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सार्वजनिक विभागमार्फत समन्वयको कार्य अगाडि बढाउने २. कमल पोखरी पार्कको नाम रज्जना लिपिमा लेख्न सार्वजनिक निर्माण विभागले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने ।



क्र सं	योजनाको नाम	बडानं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
					३. पार्कमा सदाबहार सरसफाइ र हरियाली कायम राख्ने कार्यमा सार्वजनिक निर्माण विभाग वातावरण व्यवस्थापन विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाका बिचमा समन्वय गरेर गर्न निर्देशन दिने ।
१३.	Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction	६	रु. २ करोड ६९ लाख ८७ हजार ९३ रुपैयाँ र ७६ पैसा स्वीकृत लागत (भ्याट र पिएस सहित)	२०८२/११/ ५	महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको कर्मरोग्ग समाज केन्द्र भवन साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएकोले यस भवनलाई समाजले अधिकतम उपयोग गर्ने ।
१४.	Construction of community Building of Humla	६	रु. २ करोड ९९ लाख १५ हजार ३ सय ९०	२०८२/११/ ५	महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको हुम्ला लिमि समाजको साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएको भवनलाई



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
	Limi Samaj		रुपैयाँ ८० पैसा		हालकै अवस्थामा यसको अधिकतम उपयोग गर्ने ।
१५.	Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan	६	रु. २ करोड ४९ लाख ६० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ४४ पैसा (भ्याट र पिएस समेत)	२०८२/११/ ५	महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको बौद्ध समाज केन्द्र भवन साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएकोले यस भवनलाई समाजले अधिकतम उपयोग गर्ने ।
१६.	Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park		रु. २२ करोड ९६ लाख ६० हजार ९९ रुपैयाँ र ३९ पैसा	२०८२/११/ २९	१. रंगशालाको भवन अपाङ्गतामैत्री भएको नपाइएकोले भवनलाई अपाङ्गतामैत्री एवं सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउन र्यामका साथै माथिल्लो तलामा जानको लागि कम्तीमा १ वटा हीलचियर अट्ने लिफ्ट बनाउने । २. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री अर्जुन अर्याल र

(Signature)

क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
					माया अवस्थीले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी परियोजनाको गुणस्तरियता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१७.	Construct ion of Skateboa rd Park	५	७ करोड ९८ लाख ४३ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित)	२०८२/११/२९	परियोजना सम्बद्ध साइट इन्जिनियरले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरियता कायम राख्दै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।
१८.	कुमारी घर वसन्तपुर	२५	१ करोड ७ लाख ७ सय ४५ रुपैयाँ ७ पैसा	२०८२/१२/५	१. छानामा रहेको झिंगटीबाट पानी चुहिने समस्या नआउने गरी विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने । २. वर्षायाम सुरु हुन भन्दा अगाडि नै काम सक्ने गरी काम जनशक्ति बढाएर काम गर्न निर्देशन भयो । ३. कुमारी घरमा प्रयोग भएका काठहरूको मौलिकता

(Signature)

क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
					र त्यसको सुन्दरता कायम रहने साथै क्षति नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने ।
१९.	जुद्ध बारुणयन्त्र	२३	३ करोड ३३ लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ	२०८२/१२/५	परियोजना विश्वसम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र भएको हुनाले सो सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण परिपालन गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइ कार्य गर्नुपर्ने ।
२०.	पचली भैरव	१२		२०८२/१२/१९	१. भवन परिसरमा शौचालय बनाउन आवश्यक देखिएको हुँदा २ पुरुष, २ महिला र १ अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य गर्ने २. भवन नजिकै रहेको अस्थायी संरचनाले नयाँ बन्ने भवनको सुन्दरता घटाउने हुँदा उक्त भवनलाई यथासम्भव सौन्दर्यीकरणका लागि ध्यान दिने ।
२१.	टेकू भवानी	१२	२ करोड ३३ लाख ४८	२०८२/१२/१९	१. यस्ता खालका पुरातात्विक महत्वकास्थलको पुनर्निर्माणमा



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
	माता नजिकैको पाटी सत्तल		हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ ४३ पैसा		वृहत योजना सहित DPR गरिनुपर्ने। २. निर्माण कार्यमा तिव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने। ३. तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित विभाग र कर्मचारीले निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने
२२.	३२ वडा कार्यालय	३२	२० करोड २९ लाख ११ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ ३८ पैसा (भ्याट र पिएस कन्टिजेन्सी सहित)	२०८२/१२/२७	काठमाडौं महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी परियोजनाको गुणस्तरियता कायम गर्दै निर्धारित समयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने।
२३.	पेप्सीकोला को	३२		२०८२/१२/२७	१.फुटबल ग्राउण्डको बहुउपयोग हुने गरी तयारी



क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
	फुटबल ग्राउण्ड				गर्ने र यसको प्रयोग सोही बमोजिम हुनुपर्ने । २. फुटबल ग्राउण्डको जमिनमुनिको पानीको सतहलाई पुनरभरण गर्नको लागि पर्याप्त संख्यामा Recharge Pit को प्रबन्ध गरी परियोजनालाई हरेक दृष्टिले वातावरणमैत्री बनाइनु पर्ने ।
२४.	नरेफाँट मनोहरा करिडोर सडक पिच (धुलो रहित सडक स्वर्णिस योजना)	३२	८० करोड २३ लाख ०३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ १९ पैसा (भ्याट र पिएस सहित)	२०८२/१२/ २७	
२५.	Construction of single cell box culvert	२८	९० लाख ४० हजार ५ सय ५०	२०८३/१/ ११	परियोजनाको निर्माण कार्यमा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम रहने गरी निर्धारित

Handwritten signature

क्र सं	योजनाको नाम	वडा नं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
	निर्माण कार्य		रुपैयाँ ८० पैसा (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित)		समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभाग र साइट इन्जिनियरको निगरानी तथा सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले परियोजना निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ कार्य गर्नुपर्ने ।
२६.	वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण कार्य	काम पा २२	७५ लाख ६५ हजार २ सय ०९ रुपैयाँ ५२ पैसा (भ्याट र ओभरहेड बाहेक, पिएस सहित)	२०८३/१/ १७	१. वटु गुगुंचा मन्दिर कति सालमा बनेको हो, त्यसको पुनर्निर्माण कहिले गरियो र पुनर्निर्माण गर्दा कलाकृति लगायतका कुन कुन स्थान र भागमा र के के नयाँ कलाकृति थपियो भन्ने विषय पछाडिको पुस्ताले पनि सहजै जानकारी लिन र स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरी सम्बन्धित इन्जिनियरले अभिलेखबद्ध गरी विभागमा जानकारी गराउने । २. परियोजनाको निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्दै निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभाग र साइट इन्जिनियरले निरन्तर

(Signature)

क्र सं	योजनाको नाम	बडानं	स्वीकृत लागत	अनुगमन गरिएको मिति	अनुगमन पश्चात दिइएका सुझाव
					सुपरिवेक्षण गरी निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउनु पर्ने ।
२७.	गोमा गणेश मन्दिर पुननिर्माण	काम पा २२	१ करोड ५८ लाख १ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ ७९ पैसा (भ्याट र पिएस सहित)	२०८३/१/ १७	१ हाल चालु अवस्थामा रहेको यस परियोजनाको परिसरमा लगाइएको पर्खालको बाहिर रहेको सडकको फुटपाथमा राखिएका निर्माणका सामग्रीहरु तुरुन्त हटाई फुटपाथ सहज आवागमनको लागि खुला गर्ने र सो विषयको जानकारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीले योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइमा गराउने । २ पुननिर्माण कार्यमा निर्धारित गुणस्तरियता कायम गर्दै तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने ।



काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रमुख समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ

स्वीकृत वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्न कठिनाई भएको देखिन्छ ।

२ बजेट विनियोजन र खर्च क्षमताबीच अन्तर

कतिपय कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था सोही अनुपातमा आँधी बढ्न नसकेको देखिन्छ । यसबाट विनियोजित बजेटको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने र स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा चुनौती उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ ।

३ अनुगमनमा नतिजामुखी दृष्टिकोणको कमी

अनुगमनका क्रममा काम सम्पन्न भए/नभएको अवस्थालाई मात्र हेर्ने प्रवृत्तिभन्दा कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि, सेवा गुणस्तर, प्रभाव र नागरिक सन्तुष्टिलाई समेत आधार बनाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महानगरपालिकाले पनि अनुगमनलाई तुलना गर्न मिल्ने र परिणाम देखिने सुधारको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

४ अनुगमनबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन कमजोर

अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन तथा सुझावहरू कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा नियमित फलोअपको आवश्यकता देखिन्छ । निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा जिम्मेवारी निर्धारण गरी समयमै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

५ तथ्याङ्क तथा प्रगति विवरणमा एकरूपताको अभाव

विभिन्न विभाग, महाशाखा, एकाइ, आयोजना तथा वडा कार्यालयबाट प्राप्त प्रगति विवरणमा तथ्याङ्कको ढाँचा, मापन विधि र विवरण प्रस्तुत गर्ने तरिकामा एकरूपता कायम गर्न थप सुधार आवश्यक देखिन्छ ।



६ विभाग तथा वडा तहबीच समन्वयको आवश्यकता

योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदनका क्रममा सम्बन्धित विभाग, एकाइ, आयोजना, र वडा कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

७ अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमता

महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र र योजनाको संख्या ठूलो भएकाले सबै योजना तथा कार्यक्रमको नियमित, गुणस्तरीय र परिणाममुखी अनुगमन गर्न पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, समय तथा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

८ अनुगमन प्रणालीलाई डिजिटल तथा तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने

अनुगमनका तथ्याङ्कलाई एकीकृत प्रणालीमा अभिलेख राख्ने, प्रगति अद्यावधिक गर्ने र विगत तथा वर्तमान प्रगतिबीच तुलना गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक देखिन्छ। महानगरपालिकाको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइबाट हाल पनि विभिन्न निकायबाट प्रगति विवरण माग्ने तथा अनुगमन समितिहरू अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ।

निष्कर्ष

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट महानगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था पहिचान तथा विश्लेषण गर्न महत्वपूर्ण आधार प्राप्त भएको छ। अनुगमन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी तीव्रता दिनु आवश्यक देखिएको छ। अनुगमन प्रणालीले योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, देखिएका समस्या, उपलब्धि तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पहिचान गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ। तर बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन, खर्च प्रगति, अनुगमनबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन र अपेक्षित नतिजाबीच अझै थप समन्वय आवश्यक रहेको देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा अनुगमनलाई नतिजा, गुणस्तर, प्रभावकारिता र नागरिकले प्राप्त गरेको वास्तविक लाभ मापन गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।



अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, विभाग, एकाइ, आयोजना तथा वडा तहबाट नियमित अनुगमन गरी मासिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा एकीकृत वार्षिक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नगर कार्यपालिकासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन → समस्या पहिचान → निर्देशन → सुधार → पुनःअनुगमन → नतिजा मूल्यांकनको चक्रलाई संस्थागत गर्न सकेमा योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउन सकिने देखिन्छ।

अन्तत आगामी वर्षको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई तथ्यमा आधारित, नतिजामुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। महानगरपालिकाका प्रशासनिक एकाइहरू र वडा कार्यालयहरूबाट नियमित रूपमा भएका अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरूको प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकेमा आगामी दिनमा महानगरपालिकाको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, योजना कार्यान्वयनमा सुधार, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकप्रति जवाफदेहिता थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल मंसिर ४ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाउँ लगायत समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजनास्थलमा Dry Riser Pipe विछ्याउने कार्य हुनेछ । उक्त कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा रु. २ करोड विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ का - Manikul Tole, Shanti Basti Galli, Dhaubangal Galli, वडा नं. २ - Sahamati Marga; वडा नं. १४ - Kalanki Temple, Sunar Gaun Piplabot, Rabibhawan - Santoshi Marga - Laxmi Narayan Temple; वडा नं. ३० - Janagoreto Galli - Prithak Galli, वडा नं. २६ - Sukubahal Galli, Samakhusi Marga- Sukubahal Marga - Pipalbot (Narayan Temple) , वडा नं. १६ - Sharan Galli Adarsha Nagar Galli, वडा नं. १९ - Yatakha Bahal र Chasando Galli मा सो परियोजना अन्तर्गत Dry Riser विछ्याउने कार्य भइरहेको पाइयो । यो योजना सम्पन्न भइसके पछि ठूला बारुणयन्त्र (दमकल) प्रवेश गर्न नसक्ने उल्लिखित साँघुरा गल्लिहरुमा हुन सक्ने आगलागीजन्य विपद्को जोखिम कम हुन जाने देखिन्छ । यसबाट सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा समेत प्रगति हुने देखिन्छ ।

ठेक्का नं. १६-२३-०८१-८२-NCBW-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि Salabya Nirman Sewa, भक्तपुरलाई मिति २०८२ जेठ २५ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ असार १ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८२ चैत्र ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । १ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याटसहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा १ करोड १७ लाख २ हजार ४ सय ५० रुपैया ९१ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ४३ लाख ३५ हजार ५ सय ६८



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC अनुगमन प्रतिवेदन

रुपैया ८६ पैसा (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको र यसबाट हालसम्म ३७.०४% वित्तीय र ४०.०५ % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा विपद् व्यवस्थापन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धीका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति नागरिकहरुको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरु प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरुमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री जीवन रेग्मीले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC अनुगमन प्रतिवेदन

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

अनुगमनका क्रममा परियोजनास्थलमा उपस्थित स्थानीय जनताको अनौपचारिक धारणा बुझ्दा परियोजनाका प्रति उनीहरूमा गहिरो अभिरुची रहेको पाइयो । वडा कार्यालय तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको र योजनाका प्रति उनीहरूले अपनत्वभाव प्रकट गर्दै जनताको जीउ धनको सुरक्षासँग जोडिएका यस प्रकारका योजनाहरू बढी भन्दा बढी मात्रामा तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको मध्यमबाट राहदानी शहरलाई सुरक्षित बसोवासयुक्त शहरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

८ अनुगमनपछि दिइएका सुझावहरू

१. योजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँहरूमा तत्काल प्रेशर टेष्ट गर्ने,
२. परियोजना सम्पन्न भए पछि pressure test गरेर मात्र परियोजना बुझिलिने ।
३. सम्पन्न परियोजनाको सावधिक रूपमा नियमित परिक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि सम्बन्धित विभागले कार्ययोजना तयार गरी सो बमोजिम निर्देशन दिने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फाराम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नाम थर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।


१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फाराम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरू



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of
KMC अनुगमन प्रतिवेदन

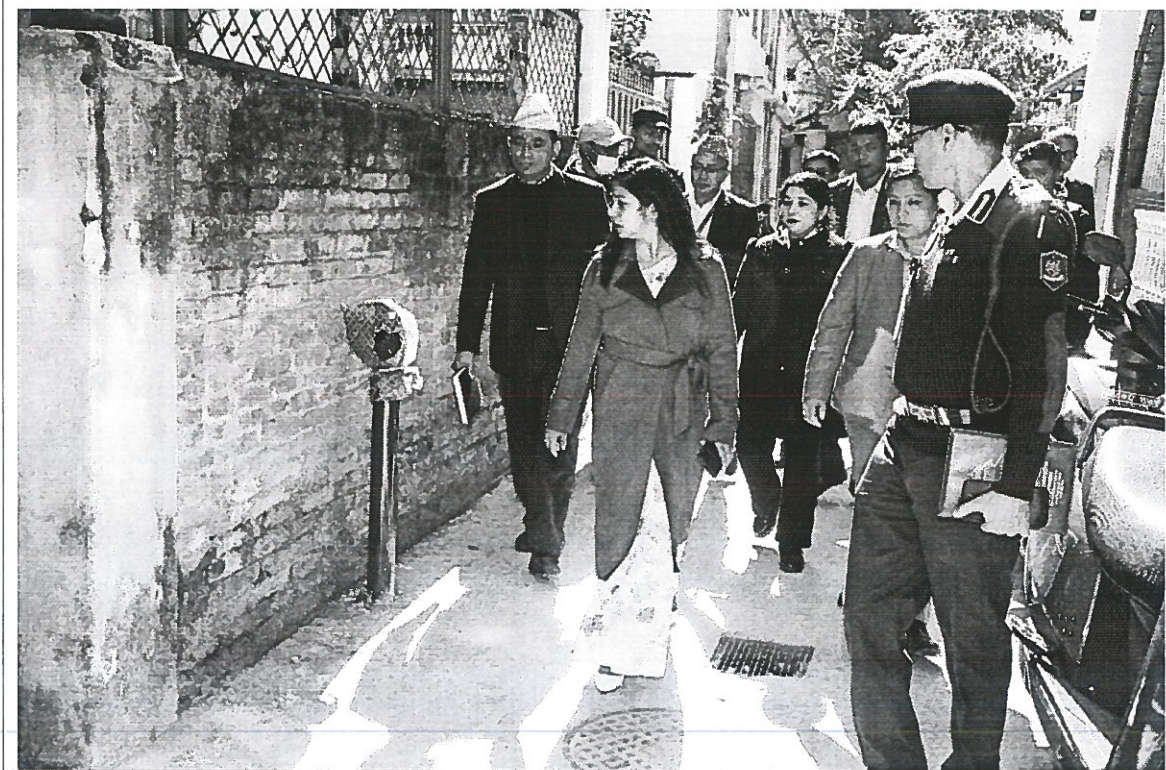

Dr. X.

Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल मंसिर ४ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाउँ लगायत समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजनास्थलमा Dry Riser Pipe विछ्याउने कार्य हुनेछ । उक्त कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा रु. २ करोड विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ का - Manikul Tole, Shanti Basti Galli, Dhaubangal Galli, वडा नं. २ - Sahamati Marga; वडा नं. १४ - Kalanki Temple, Sunar Gaun Piplabot, Rabibhawan - Santoshi Marga - Laxmi Narayan Temple; वडा नं. ३० - Janagoreto Galli - Prithak Galli, वडा नं. २६ - Sukubahal Galli, Samakhusi Marga- Sukubahal Marga - Pipalbot (Narayan Temple), वडा नं. १६ - Sharan Galli Adarsha Nagar Galli, वडा नं. १९ - Yatakha Bahal र Chasando Galli मा सो परियोजना अन्तर्गत Dry Riser विछ्याउने कार्य भइरहेको पाइयो । यो योजना सम्पन्न भइसके पछि ठूला बारुणयन्त्र (दमकल) प्रवेश गर्न नसक्ने उल्लिखित साँघुरा गल्लिहरुमा हुन सक्ने आगलागीजन्य विपद्को जोखिम कम हुन जाने देखिन्छ । यसबाट सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा समेत प्रगति हुने देखिन्छ ।

ठेक्का नं. १६-२३-०८१-८२-NCBW-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि Salabya Nirman Sewa, भक्तपुरलाई मिति २०८२ जेठ २५ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ असार १ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८२ चैत्र ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । १ करोड ९० लाख ३६ हजार ८ सय ८७ रुपैया १७ पैसा लागत (भ्याटसहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा १ करोड १७ लाख २ हजार ४ सय ५० रुपैया ९१ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ४३ लाख ३५ हजार ५ सय ६८



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC

रुपैया ८६ पैसा (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको र यसबाट हालसम्म ३७. ०४% वित्तीय र ४०. ०५ % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा विपद् व्यवस्थापन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धीका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति नागरिकहरूको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरू प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री जीवन रेग्मीले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

अनुगमनका क्रममा परियोजनास्थलमा उपस्थित स्थानीय जनताको अनौपचारिक धारणा बुझ्दा परियोजनाका प्रति उनीहरूमा गहिरो अभिरुची रहेको पाइयो । वडा कार्यालय तथा वडाका



Dry Riser Laying Works for Connecting Fire Fighters at Different Locations of KMC

जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको र योजनाका प्रति उनीहरूले अपनत्वभाव प्रकट गर्दै जनताको जीउ धनको सुरक्षासँग जोडिएका यस प्रकारका योजनाहरू बढी भन्दा बढी मात्रामा तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको मध्यमबाट राहदानी शहरलाई सुरक्षित बसोवासयुक्त शहरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

८ अनुगमनपछि दिइएका सुझावहरू

१. योजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँहरूमा तत्काल प्रेशर टेष्ट गर्ने,
२. परियोजना सम्पन्न भए पछि pressure test गरेर मात्र परियोजना बुझिलिने ।
३. सम्पन्न परियोजनाको सावधिक रूपमा नियमित परिक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि सम्बन्धित विभागले कार्ययोजना तयार गरी सो बमोजिम निर्देशन दिने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फाराम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नाम थर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फाराम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरू



र.प.

Construction of community Building of Humla Limi Samaj

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ फागुन ५ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Construction of community Building of Humla Limi Samaj KMC-06** नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख सम्बन्धित कर्मचारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Construction of community Building of Humla Limi Samaj KMC-06 नामक यो परियोजनाका लागि स्वीकृत लागत रु. २ करोड ९९ लाख १५ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको पाइयो । ठेक्का नं. ०३-०३-०८१-८२-NCBW-HTD-KMC को यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिति २०८२ जेठ २३ गते कायदेशि दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजना २०८३ जेठ २२ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद कार्य अगाडि बढाइएको यस परियोजनाको प्रतिस्पर्धा गर्दा रु. २ करोड ११ लाख ९० हजार ८ सय २० रुपैयाँ २ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा भौतिक प्रगति २० प्रतिशत देखिन्छ । हुम्ला लिमि समाजको भवन निर्माण परियोजनाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पनि विशेष महत्व रहेको छ । हुम्लाबाट बसाइ सरी आएका शेर्पा जातिका मानिसहरुले आफ्नो सामाजिक बनावट र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत आफ्नो पहिचान दिने आस्थाको धरोहरका रुपमा विकास गर्दै हुम्ला लिमि समाजमा करिब २०० घर परिवार आवद्ध रही यसको जन्म भएको पाइयो । सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकतालाई विशेष महत्व दिने यस समाजको विशिष्ट पहिचान भएकोले समाजले आफ्नै बलबुताबाट चन्दा रकम संकलन गरी भवन निर्माणको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत सहयोग माग भइ आएको पाइयो । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी र कागजातहरु माग गरी परियोजना सम्बन्धी अध्ययन गरियो । परियोजना सम्बद्ध कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो ।



Construction of community Building of Humla Limi Samaj

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

स्थलगत अवलोकनका क्रममा परियोजना सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको उपस्थिति रहेको र परियोजना सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. यस परियोजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध विभागका तोकिएका इन्जिनियरहरूले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

१ उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि हाल महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको भएतापनि परियोजना सम्बद्ध भवन आरसिसि पक्की नभएकोले भवनको थप व्यवस्थितिकरण तथा सबलीकरणका लागि पुनः आवश्यक परेको अवस्थामा महानगरपालिकाले अपनत्व लिइदिनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको ।

२ परियोजना क्षेत्रका वरिपरी रहेका मन्दिर लगायतका संरचनाको विकासका लागि महानगरपालिकाबाट थप सहयोगको अपेक्षा रहेको ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको हुम्ला लिमि समाजको साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएको भवनलाई हालकै अवस्थामा यसको अधिकतम उपयोग गर्ने ।

Construction of community Building of Humla Limi Samaj

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु



[Handwritten signature]

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

[illegible]

वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि


अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८३ साल वैशाख १७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २२ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवाला समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिकाको भित्रि सहरमा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २२ को वटुस्थित वटु गुगुंचा मन्दिर १८ औं शताब्दीमा बनेको मन्दिर हो भन्ने भनाइ स्थानीयबासीको रहेको पाइयो । वटु गुगुंचा मन्दिरमा नवदुर्गाको मुर्ती राखी पूजा गरिदै आएको रहेछ । मन्दिर निकै वर्ष पुरानो भई जीर्ण अवस्थामा पुगेको हुनाले स्थानीयबासीको जानकारी तथा मागलाई मध्येनजर गरी मन्दिरलाई पुरै भत्काइ वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण योजना निर्माण तथा सोको लागि बजेट विनियोजन भई कार्य भएको जानकारी पाइयो । उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैली र स्वरूपमा गर्ने गरी मन्दिरको Drawing Design भएको पाइयो । पुनर्निर्माण कार्य गर्दा मन्दिर भवनमा रहेको नवदुर्गाको मूर्तिलाई सोही स्थानमा नै राखी मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा त्यहाँ नजिकै रहेको वटु नाथेस्वर गुठी भवनमा राखी दैनिक पूजा आराधना गर्दै आएको भन्ने जानकारी अनुगमनको क्रममा स्थानीयबासीबाट भयो । पुनर्निर्माण कार्य गर्दा मन्दिर टुँडालमा राखिएका तथा त्यहाँ प्रयोग भएका कलाकृतिहरु पुनःउपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, विग्रेका तथा टूटेफूटेकालाई नयाँ काष्ठकलाको प्रयोगबाट नयाँ कलाकृतिहरु जस्तै मूर्तिका हात, तरबार आदिलाई नयाँ बनाई सोही स्थानमा जोडेर पुरानै स्वरूपका कलाकृतिहरु तयार गरिएको जानकारी परियोजनाको लागि तोकिएका साइट इन्जिनियरबाट भयो ।

वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण नामक यो परियोजनाका लागि कुल लागत अनुमान ७५ लाख ६५ हजार २ सय ०९ रुपैयाँ ५२ पैसा(भ्याट र ओभरहेड बाहेक, पिएस सहित) रहेको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२/०२/२७ रहेको र उक्त परियोजना २०८३/०२/३१ मा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी २०८२/०२/२७ गते कायदेशि दिएको पाइयो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ४९ लाख भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । उक्त परियोजनाको अनुगमन गरिएको मितिसम्म वित्तीय प्रगति ६६% र भौतिक प्रगति ८५% देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा



वटु गुगुंचा मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

अनुगमन गर्नु पूर्व परियोजनाका बारेमा परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभाग सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा आवश्यकतानुसार अवलोकन विधि, अन्तरसंवाद विधि तथा प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
३. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

मन्दिर ढुङ्गालमा राखिएका तथा त्यहाँ प्रयोग भएका कलाकृतिहरु पुनःउपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, विघ्रेका तथा टूटेफूटेकालाई नयाँ काष्ठकलाको प्रयोगबाट नयाँ कलाकृतिहरु जस्तै मूर्तिका हात, तरबार आदिलाई नयाँ बनाई सोही स्थानमा जोड्दा पुरानै स्वरूपका कलाकृतिहरु तयार गरि कलाकृतिको पूर्ण आकार आउने गरी गर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

वटु गुगुंचा मन्दिरको पुनः निर्माण कार्य गर्दा मन्दिरमा रहेका नवदुर्गा लगायतका मूर्तिहरु नजिकै रहेको वटु नाथेस्वोर गूठीमा सुरक्षितका साथ राखिएमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सोही मूर्तिहरुलाई धार्मिक विधि अनुसार क्षमा पूजा लगायतका कार्य सम्पादन गरी मन्दिरमा राखिने भन्ने सरोकारवालाको धारणा रहेको ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

१. वटु गुगुंचा मन्दिर कति सालमा बनेको हो, त्यसको पुनर्निर्माण कहिले गरियो र पुनर्निर्माण गर्दा कलाकृति लगायतका कुन कुन स्थान र भागमा र के के नयाँ कलाकृति थपियो भन्ने विषय पछाडिको पुस्ताले पनि सहजै जानकारी लिन र स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरी सम्बन्धित इन्जिनियरले अभिलेखबद्ध गरी विभागमा जानकारी गराउने ।

२. परियोजनाको निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्दै निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभाग र साइट इन्जिनियरले निरन्तर सुपरिवेक्षण गरी निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउनु पर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर



वटु गुगुंछा मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची



अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको

छ। ११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु



[Handwritten signature]

बटु गुगुंछा मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

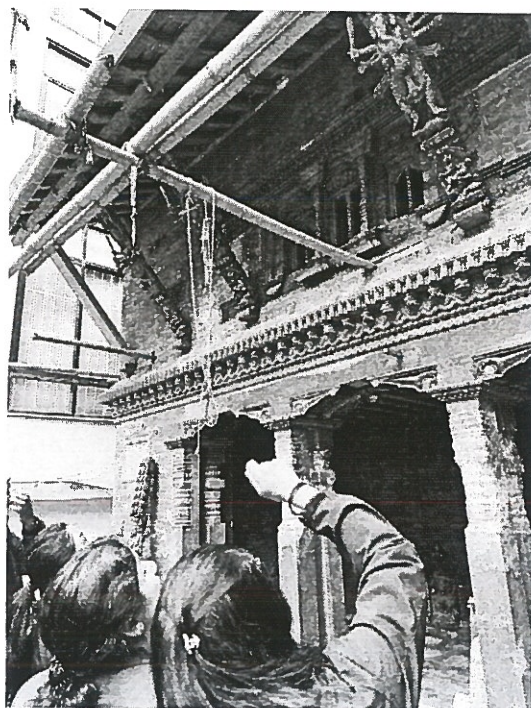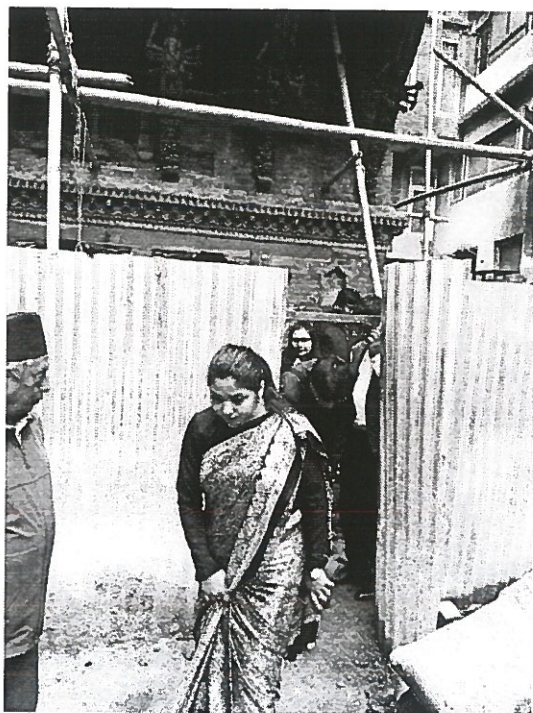

Day

Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल फागुन ५ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan** नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख सम्बन्धित कर्मचारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan नामक यो परियोजनाका लागि स्वीकृत लागत रु. २ करोड ४९ लाख ६० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ४४ पैसा (भ्याट र पिएस समेत) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो ।

ठेक्का नं. २७-११९-NCBW-०७९-०८०-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८० कात्तिक १५ गते कायदिस दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८० कात्तिक १५ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी म्याद थप पेस भएको देखिन्छ । योजनाको सम्झौता रकम रु २ करोड ४९ लाख ६० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ४४ पैसा (भ्याट र पिएस समेत) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरेको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको वित्तिय प्रगति हेर्ने हो भने ८५ % र भौतिक प्रगति ८५ % देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढिरहेको पाइयो । योजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भएको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चलनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिमनै कार्य भइरहेको,

Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि हाल महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको मा आभार व्यक्त गरी महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको बौद्ध समाज केन्द्र भवन साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएकोले यस भवनलाई समाजले अधिकतम उपयोग गर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

Construction of Buddha Samaj Kendra Bhawan
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Handwritten signature

Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल चैत्र १९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen KMC-12** नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १२ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen KMC-12 नामक यो परियोजनाका लागि कुल लागत अनुमान ४ करोड ३६ लाख ५६ हजार ९६ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको पाइयो । यस परियोजनाको ठेक्का नं. **12-14-081-082-NCBW-HTD-KMC** रहेको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२/१०/१४ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ मंसिर ३० मा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी २०८२ पौष ०९ गते कार्यदिश दिएको पाइयो । ४ करोड ३६ लाख ५६ हजार ९६ रुपैयाँ ७ पैसाको कुल लागत अनुमान भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ३ करोड ७१ लाख ७ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ ६१ पैसामा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ३०,००,०००/०० भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । चालु परियोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति १०% र भौतिक प्रगति ५% देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चलनमा रहेको



Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification मा सामान्य परिवर्तन भई कार्य भइरहेको,

३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,

४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

आयोजनाको भर्खरै मात्र काम सुरु भएको कारणले थप सुधार हाल भन्नुपर्ने नदेखिएको ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

पंचली भैरव मन्दिर परिसरका अन्य संरचना समेत सम्पदामैत्री र परम्परा झल्किने खालका मात्र निर्माण गरी सौंदर्यीकरणमा अभिवृद्धि गर्ने र ऐतिहासिकताको प्रवर्दन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

१. भवन परिसरमा शौचालय बनाउन आवश्यक देखिएको हुँदा २ पुरुष, २ महिला र १ अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य गर्ने ।

२. भवन नजिकै रहेको अस्थाई संरचनाले नयाँ बन्ने भवनको सुन्दरता घटाउने हुँदा उक्त भवनलाई यथासम्भव सौन्दर्यीकरणका लागि ध्यान दिने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।


१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको छ

Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen


परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

११. तस्वीरहरु:

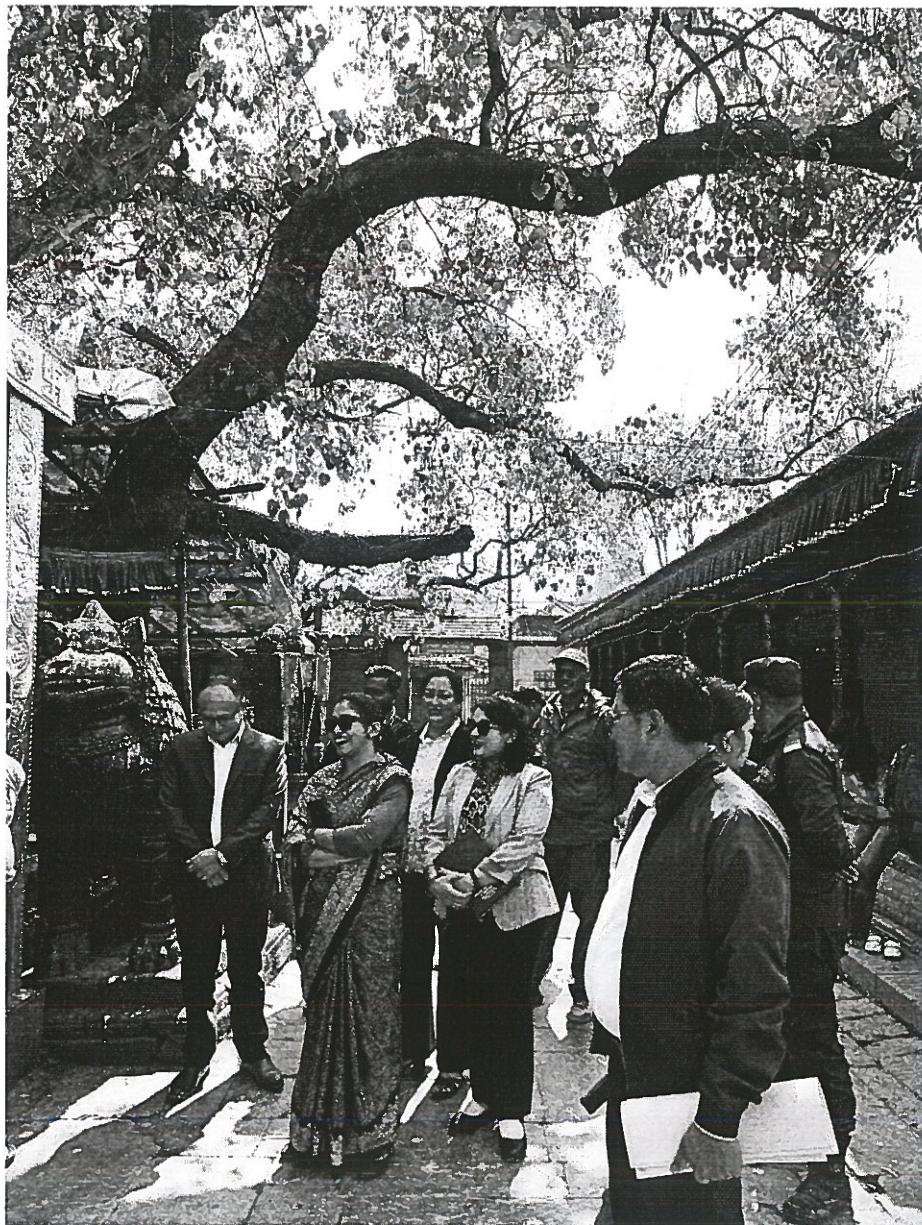

[Handwritten signature]

Construction of Pachali Bhairav Bhyoe Chhen परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

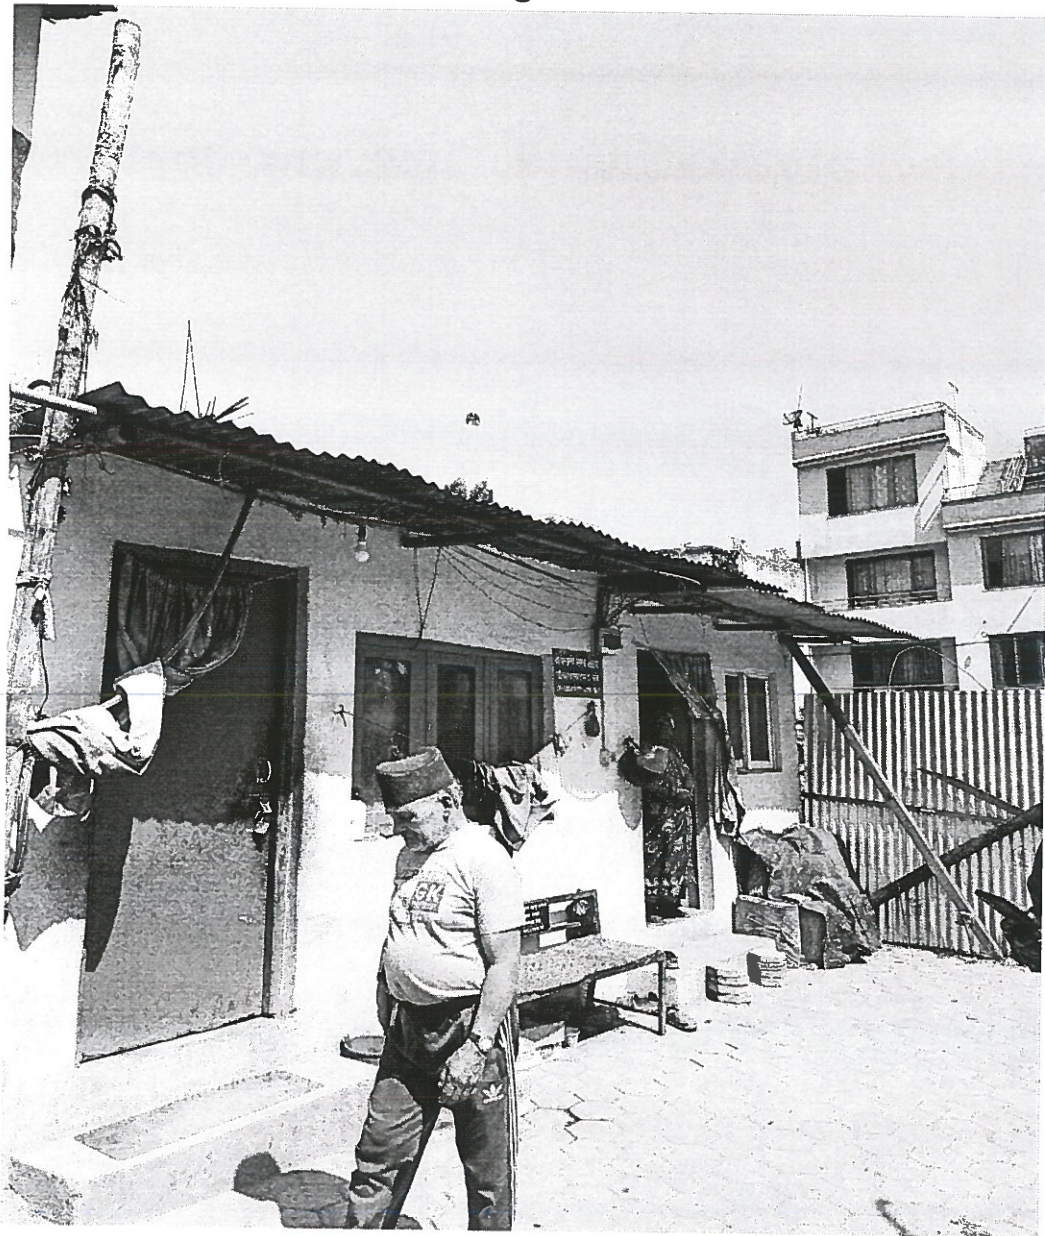

Dr. X.

Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ माघ २३ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)** परियोजना अन्तर्गत कमलपोखरीलाई परम्परागत, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पोखरीका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना अनुरूप कमलपोखरीको पार्क र फेन्सिङ् निर्माण गर्ने कार्यको अनुगमन गरिएको हो । काठमाडौंको केन्द्रीय भागमा रहेको कमलपोखरीलाई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख सम्बन्धित कर्मचारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

करिब २३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमलपोखरीको पार्क र **Fencing** निर्माण कार्यका लागि स्वीकृत लागत ४ करोड ६ लाख ८१ हजार ८० रुपैयाँ १४ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) रहेको पाइयो । ठेक्का नं. २०-५४-NCBW-०८०-०८१-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८१ भदौ १९ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य सुरु मिति २०८१ भदौ १९ रहेको र उक्त परियोजना २०८२ मंसिर १५ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ४ करोड ६ लाख ८१ हजार ८० रुपैयाँ १४ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) को लागत स्वीकृत भए तापनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्दा छनोट भएका निर्माण व्यवसायीसँग ३ करोड ५८ लाख ८७ हजार ५२ रुपैयाँ ७७ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी संझौता गरेको देखियो ।

अनुगमन गरिएको मितिसम्म ३ करोड ४ लाख ४३ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ ८३ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) भुक्तानी भैसकेको र अन्तिम बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइयो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति १००% र वित्तिय प्रगति भने ८४.८३% देखिन्छ । अनुगमनको क्रममा कमलपोखरीको वरिपरि पैदल मार्ग रहेको पाइयो भने चिल्ड्रेन पार्क, मकराकृतिका ढुंगेधारा, अपाङ्गमैत्री शौचालय, खुला व्यायामशाला र उद्यान कमलपोखरीका विशेषता रहेको देखियो । पोखरीका चार ओटा हरेक कुनामा आकर्षक र संस्कृति झल्किने मण्डपका साथसाथै पूर्वतिर मुलढोकासँगै एउटा ठूलो पोखरी वरिपरि ५ वटा मण्डपले यस कमलपोखरीको सौन्दर्यता अझै बढाएको देखियो । पोखरी छिर्ने गेटलाई परम्परागत नेपाली शैलीको र पोखरी निर्माण गर्दा नेपाली इट्टा र दर्शन ढुङ्गा प्रयोग गरिएको पाइयो । उक्त परियोजना सम्बन्धित वडा कार्यालयको मागबमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको

Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय सरोकारवालासँगको समन्वयमा कार्य जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नुपूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । यो परियोजनालाई बहुउपयोगी रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,

२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,

३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,

४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनको क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

पोखरीको परिसरमा भूईँ ओच्छ्याइएका तथा पर्खालमा प्रयोग गरिएका ढुंगाहरू हल्लिएका, छिटफुट टुटेफुटेका, जमिन सतहमा समथर भइ नमिलेको देखिएकोले सोलाई पूर्ण रूपमा मर्मत तथा निर्माण गरेपछि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

१ कमलपोखरी र यसको परिसरको सुरक्षाको लागि आवश्यकताबमोजिम सिसि क्यामरा महानगरपालिकाले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२ पोखरीमा सदाबहार रूपमा पानीको सतह एकैनाशको कायम रहिरहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३ पोखरीको नामकरण नै कमल फूलको नामबाट भएको हुँदा यहाँ कमलको प्राकृतिक फूल लगाउँदा यसको परम्परागत संस्कृति मूल्य मान्यताको संरक्षण हुनुको साथै सौन्दर्यीकरणमा समेत बढोत्तरी हुने ।

Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

४ पोखरीमा रहेका जलचर जलजीवहरू माछा लगायतको संरक्षण सम्बर्धनमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

८ अनुगमनपछि दिइएका सुझावहरू

- १ पोखरीमा सदाबहार रूपमा पानीको सतह एकैनाशको कायम रहिरहने व्यवस्थाका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सार्वजनिक विभागमार्फत समन्वयको कार्य अगाडि बढाउने ।
- २ कमल पोखरी पार्कको नाम रञ्जना लिपिमा लेख्न सार्वजनिक निर्माण विभागले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने ।
- ३ पार्कमा सदाबहार सरसफाइ र हरियाली कायम राख्ने कार्यमा सार्वजनिक निर्माण विभाग वातावरण व्यवस्थापन विभाग र उद्दान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाका बिचमा समन्वय गरेर गर्न निर्देशन दिने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थित टोलीको सुची अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ अनुगमनको क्रममा खिचिएका तस्विरहरू



[Handwritten signature]

Beautification and Maintenance of Kamal Pokhari (Phase II)

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ माघ २३ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा "Retrofitting Works of Bagdarbar" अन्तर्गत Strengthening the existing structure by improving the foundation, reinforcing masonry walls, repair and conservation works परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

बागदरबार काठमाडौंको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व भएको संरचना हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको ११ नं वडाअन्तर्गत पर्ने यो संरचनाको नामबाट नै यस ठाउँलाई संवोधन गर्दै आएको पाइन्छ । बागदरबारको इतिहास, वास्तुकला तथा सांस्कृतिक महत्वले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यसको निर्माण शाहवंश कालमा भएको अध्ययनहरुबाट थाहा पाउन सकिन्छ । विशिष्ट मौलिकता भएको पुरातात्विक निधि बागदरबारलाई हरिभवनका नामले समेत संवोधन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व/नाममा रहेको बागदरबार र यसको परिसरलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयले उपभोग/उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गरेपश्चात काठमाडौं महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालन यही दरबारबाट हुँदै आएको पाइन्छ । सम्बत् २०७२ वैशाख १२ गतेको विनासकारी महाभूकम्पले ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा रहेको यस दरबारलाई ध्वस्त बनायो । नेपालकै ऐतिहासिक महत्वको विशिष्ट भवन भएकाले पनि यसको निर्माण, पुनर्निर्माण वा रेट्रोफिटिङ्ग के गर्ने, कसरी र कस्ले गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै गर्दा भूकम्प गएको करिब १२ वर्षपछि मात्र यसको रेट्रोफिटिङ्ग गर्ने कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभागबाट सुरु भएको छ । यसको परिसरमा महानगरपालिकाअन्तर्गतको ११ नं वडा कार्यालयको भवन निर्माण भई तहाँबाट नै सेवा प्रवाह कार्य सुरु भै सकेको छ ।

बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. ७४ करोड ४७ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ १३ पैसा (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट आएको निर्माण पक्षसँग ४२ करोड ९० लाख १४ हजार ३१० रुपैयाँ ८८ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. ०३१-४५-०८१-०८२-NCBW-KMC को यो ठेक्का मिति २०८२ मंसिर १५ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य सुरु मिति २०८२ मंसिर १५ रहेको र उक्त परियोजना २०८४ मंसिर १५ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत चालु आ.व. को लागि विनियोजित बजेट ३० करोड रहेको पाइयो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति ५% देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग /वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको हुँदा कार्यान्वयनको

बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग कार्यको

अनुगमन प्रतिवेदन

चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात समेत अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,
३. निर्माण व्यवसायीबाट रेट्रोफिटिङ्ग कार्य निर्धारित समयसीमा अगावै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

१ बागदरबारका केही कोठाहरूमा महानगर प्रहरी बलको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको र केही कोठाहरूमा महानगरपालिकाको कार्यालयका मिसिल कागजात तथा पुराना फर्निचरहरू रहेकाले रेट्रोफिटिङ्ग कार्यलाई अगाडि बढाउन सहजता नभएको देखिएको हुँदा सोको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निर्माण विभागले पहल गर्नुपर्ने ।

२ बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग गर्दाको क्रममा उक्त संरचनाको जगमा बिम नरहने गरी ड्रइङ्ग डिजाइन भई कायदेशि समेत दिइ सकेको अवस्थामा अनुगमनको क्रममा जगमा बिम राख्दा संरचनाको मजबुतीका लागि बिम राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएको हुँदा सो विषयमा महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग र सार्वजनिक निर्माण विभागले छलफल गरी निर्योक्त गर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

१ बागदरबारको संरचनामा प्रयोग भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सामग्रीहरू रेट्रोफिटिङ्गको क्रममा यथोचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।

२ रेट्रोफिटिङ्गको क्रममा सम्बन्धित निकाय संस्था र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्ने ।

३ बागदरबारको मौलिक विशिष्टता कायम राख्न निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको सुनिश्चतता कायम गर्ने ।

बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग कार्यको

अनुगमन प्रतिवेदन

४ बागदरबार परिसरमा थप संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्ने ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझाव

१ बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग गर्दा मौलिकता र संरचनागत बलियोपनालाई निर्माण कार्यको प्रारम्भदेखिका हरेक प्रक्रियामा सार्वजनिक निर्माण विभागले निगरानी गर्ने ।

२ रेट्रोफिटिङ्ग कार्यमा प्रयोग भएका सामग्रीहरुको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने ।


९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्विरहरु

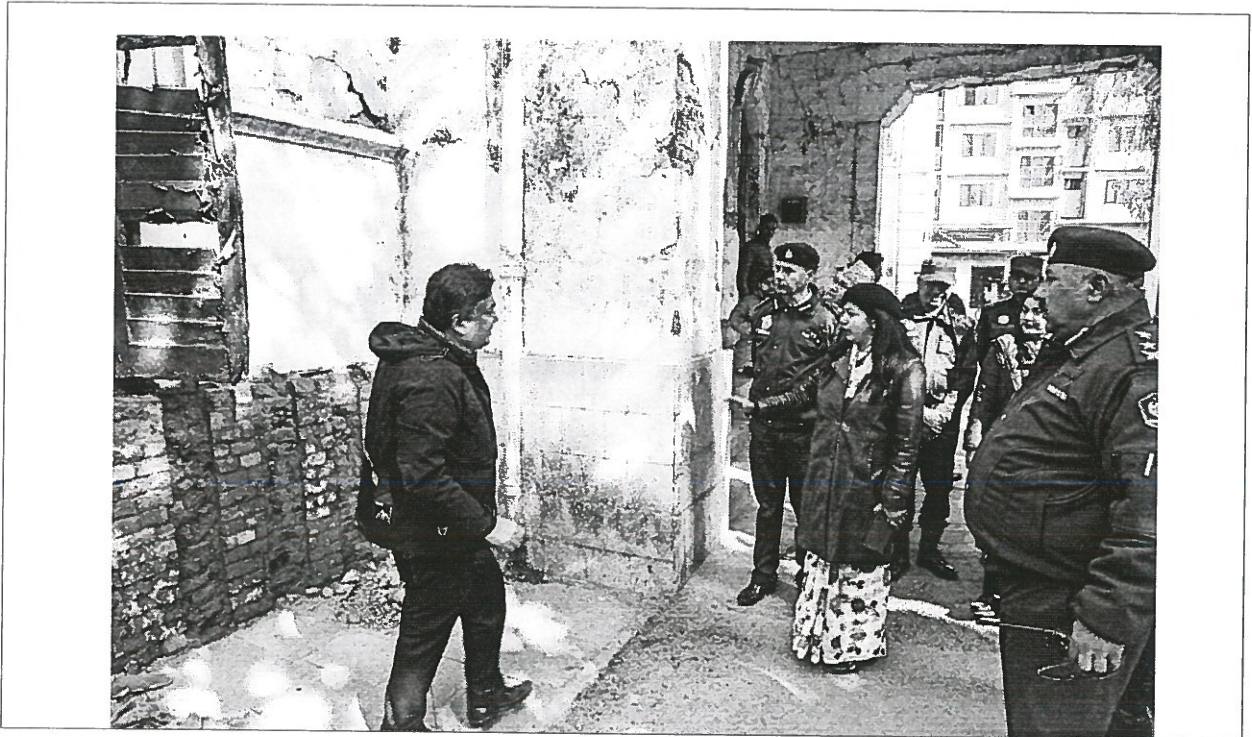

[Handwritten signature]

बागदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग कार्यको
अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

वडा नं. ३२ कार्यालय भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ चैत्र २७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा वडा नं. ३२ कार्यालय भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना वडा नम्बर ३२ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको हाल सेवा प्रवाह भैरहेको भवनबाट व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएकोले वडाबासीको सेवा प्राप्तिको सन्तुष्टी एवम् वडा कार्यालयको अवस्थालाई ध्यानमा राखी वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य छलफल पश्चात यो परियोजनाको विषय सुरुवात भएको पाइयो । महानगरबासीलाई आफ्नै भवनबाट सहज, व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ ३२ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण परियोजना सञ्चालन भएको हो । यस परियोजना निर्माण कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. २० करोड २९ लाख ११ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ ३८ पैसा (भ्याट र पिएस कन्टिजेन्सी सहित) रहेको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको निर्माण व्यवसायीसँग ३ करोड ५८ लाख ८७ हजार ५२ रुपैयाँ ७७ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. ०४-०७-०८२-०८३-NCBW-PWD-KMC को यो परियोजनाको निर्माण कार्यका लागि २०८२ माघ ११ गते कार्यदिश दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ माघ ११ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति ५% देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग/ वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात समेत अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका बीच छलफल गरी परियोजना निर्माणस्थलको अवलोकन गरियो ।



वडा नं. ३२ कार्यालय भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. परियोजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. परियोजना तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,
३. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

- १ अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
- २ महानगरपालिकाका तोकिएका साइट इन्जिनियर श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

परिवर्तित सन्दर्भमा वडा कार्यालयको कार्य विस्तार हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण सेवाको सहज प्रवाह हुने गरी संरचनालाई पर्याप्त आकार र कोठाको व्यवस्था हुने सुनिश्चितताका साथ डिजाइन भएको हुनुपर्ने । वडा कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप धान्न सक्ने र सहज सेवा प्रवाह हुने गरी आन्तरिक विभाजन भएको हुनुपर्ने

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझाव

काठमाडौं महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी परियोजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्दै निर्धारित समयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।




वडा नं. ३२ कार्यालय भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु

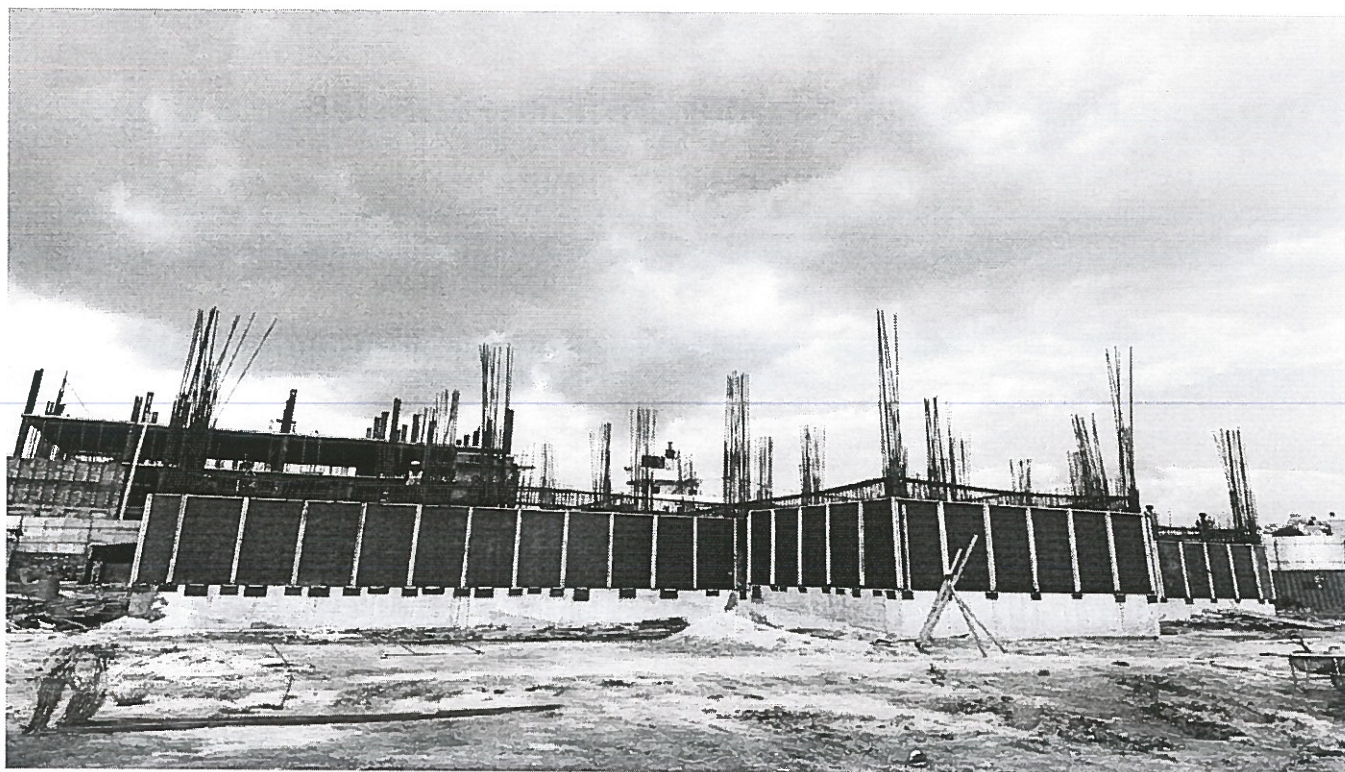

[Handwritten signature]

काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको मिति २०८०/१०/२२ गतेको बैठकबाट
स्वीकृत

**वडा नं. ३२ कार्यालय भवन निर्माण कार्य
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन**



Signature

Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल मंसिर ११ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाउँ लगायत २० नं. वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मानन्धर, वडा सदस्य श्री कञ्चना नेपाली, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु तथा यस परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजना स्थलमा ढुङ्गा छान्ने कार्य हुनेछ । उक्त कार्यका लागि जम्मा ३ करोड ५२ लाख १६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ९ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने जमल रोडदेखि असन रोड हुँदै इन्द्रचोकसम्मको Stone Paving गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो । काठमाडौंको भित्री शहरको रूपमा चिनिने यी विशेष ठाउँहरुको पहिचान अझै प्रष्टसँग झल्काउन र सर्वसाधारणको लागि पैदल यात्रीको आवतजावत सहजीकरणको लागि Stone Paving को कार्य हुने देखिन्छ ।

ठेक्का नं. १४-४६-NCBW-०८०-०८१-PWD-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि I.S. Nirman Sewa, नुवाकोटलाई मिति २०८२ असार २४ गते कायदेशि दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरू मिति २०८२ असार २४ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८२ असोज ३१ (म्याद थप) गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ ।

३ करोड ५२ लाख १६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ९ पैसा लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ३ करोड ५२ लाख १६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ९३ पैसामा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ३ करोड १७ लाख १६ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको र यसबाट

Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

हालसम्म ९०% वित्तीय र ९२ % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नुपूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजनासम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धिका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति नागरिकहरूको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरू प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू


१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी नयाँ कार्य तालिका बनाउन आदेश दिइ कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै कार्य सम्पन्न गर्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री राजु आचार्यले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।



Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

अनुगमनका क्रममा परियोजनास्थलमा उपस्थित स्थानीय जनताको अनौपचारिक धारणा बुझ्दा परियोजनाका प्रति उनीहरूमा गहिरो अभिरुची रहेको पाइयो । परियोजनाको कार्य अघि बढ्दै गर्दा वातावरण संरक्षण हुने गरि योजना तर्जुमा हुनुपर्ने कुरामा विशेष रुची पनि देखियो । वडा कार्यालय तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको र योजनाका प्रति उनीहरूले अपनत्व भाव प्रकट गर्दै पैदल यात्रीहरूको आवत जावतको सहजीकरणसँग जोडिएका यस प्रकारका योजनाहरू बढीभन्दा बढी मात्रामा तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको मध्यमबाट यस महानगरपालिकाको भित्री सडकहरूलाई बसोवासयुक्त शहरमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

१. भोटाहिटि क्षेत्रमा ढुङ्गा छाप्दा जमिन सतहमा Slope नमिलि अग्लो होचो भएर पैदल यात्रीलाई असहज भएको देखिएको र स्थानीय बासिन्दाको गुनासो समेत आएकोले यस परियोजना अन्तर्गतका त्यस्ता स्थानहरूमा तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको ।
२. परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँहरूमा जमिनमुनीको पानी पुनर्भरणका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी पानी पुनर्भरण हुने व्यवस्था मिलाउने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्बीरहरू:



Stone Paving works at Jamal-Asan-Indrachowk
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



David

खुल्लामञ्चमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल पुस ९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Maintenance and upgrading of sports infrastructure in different places of kathmandu city** अन्तर्गत खुल्लामञ्चमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाइँज्यू लगायत समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरु, कर्मचारीहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) लगायतको संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

प्राकृतिक दुबोसहितको घाँसे चउर बनाइएको यस परियोजना अन्तर्गत खुल्लामञ्चमा सतहको जमिन मिलाएर मलिलो माटो राखेपछि १४ हजार ६ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक दुबो रोपिएको पाइयो । सहरका विभिन्न ठाउँका पैदल मार्ग स्तरोन्नति गर्दा निकालिएका हेक्जागोनल ब्लकहरु ल्याएर यस ठाउँको पैदल मार्ग बनाउन पुनःप्रयोग गरिएको पाइयो । उक्त कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. ६ करोड ९८ लाख ७० हजार ३ सय १५ रुपैयाँ लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । खुल्लामञ्चलाई अझै आकर्षक बनाउन चउरको वरिपरि ४ मिटर चौडाइको पैदल बनाइएको पाइयो । उक्त पैदलमा विहान शारीरिक अभ्यास गर्न, बालबालिकाहरुका लागि स्वतन्त्र खेलन, पाका उमेरका व्यक्तिहरुका लागि टहल्न, आराम गर्न र सहरी जीवन नियाल्न सकिने ठाउँका रूपमा उपयोग हुने देखियो । यो क्षेत्र मर्निङ्ग वाकका लागि उपयुक्त मार्ग हुने र युवाहरुलाई खेल प्रशिक्षण गर्ने तथा रमाउने ठाउँको लागि पनि उपयुक्त हुने देखियो ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेको यो परियोजना ठेक्का नं. ०६-२२-NCBW--०८०-८१-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८० फागुन २४ गते कार्यदिश दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८० फागुन २४ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८१ असोज १३ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ६ करोड ९८ लाख ७० हजार ३ सय १५ रुपैयाँ स्वीकृत लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भएता पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ करोड १ लाख ९६ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ ७६ पैसा मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ५ करोड २६ लाख ६५ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ २४ पैसा (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । वित्तिय प्रगति हेर्ने हो भने हालसम्म ९९% र भौतिक प्रगति ९९% देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

खुल्लामञ्चमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । यो स्थानलाई बहुउपयोगी स्थानका रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखियो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification मा सामान्य परिवर्तन भई कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनमा क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री अर्जुन अर्याल र श्री प्रवेश ढकाल निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने ।
३. खुल्ला मञ्चको खुल्ला मैदानमा उम्रिएको अनावश्यक झारपातले रोपिएको दुवोलाई अतिक्रमण गरेको देखिएकोले त्यसको गोडमेल तथा सरसफाइका लागि उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजनालाई निर्देशन दिने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

स्थानीयबासी, स्थानीय क्लबका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिहरू समेतको रायमा सो खुल्ला मञ्चको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा खुल्ला मञ्चको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने ।



खुल्लामञ्चमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्विर



Handwritten signature

खुल्लामञ्चमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने परियोजनाको
अनुगमन प्रतिवेदन



१०/११

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल मंसिर ४ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा जुद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाईं लगायत २० नं. वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मानन्धर, समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरु, अन्य विभागहरु(कानून तथा मानव अधिकार विभाग र योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाई) परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजनास्थलमा भवन जिर्णोद्धार कार्य हुनेछ । उक्त कार्यको लागि जम्मा ९४ लाख ९६ हजार ८९ रुपैया ७५ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय, बसन्तपुरमा जुद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो

ठेक्का नं. ०२-२१-०८१-८२-NCBW-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि इन्द्रदह निर्माण सेवा, रानीवारीलाई मिति २०८२ जेठ १९ गते कायदेशि दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ जेठ १९ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८३ जेठ ११ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ९४ लाख ९६ हजार ८९ रुपैया ७५ पैसा लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भएता पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ७८ लाख ४७ हजार २ सय ४६ रुपैया ८० पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि १३ लाख ९१ हजार २ सय रुपैया (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको र यसबाट हालसम्म २०% वित्तीय र १५ % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा २३ नं. वडा कार्यालयबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धीका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति

जूद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण अनुगमन प्रतिवेदन

नागरिकहरूको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरू प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चलनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमन क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

अनुगमनका क्रममा परियोजनास्थलमा उपस्थित स्थानीय जनताको अनौपचारिक धारणा बुझ्दा परियोजनाका प्रति उनीहरूमा गहिरो अभिरुची रहेको पाइयो। वडा कार्यालय तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको र योजनाका प्रति उनीहरूले अपनत्वभाव प्रकट गर्दै सर्वसाधारण बटुवाहरू तथा आगन्तुक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरूको लागि आवतजावत गर्न जोखिमयुक्त भई जीउ धनको सुरक्षा सेमतसँग जोडिएका यस प्रकारका योजनाहरू बढी भन्दा बढी मात्रामा तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको मध्यमबाट राजधानी शहरलाई सुरक्षित बसोवासयुक्त शहरमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फरम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



जूद्ध बारुण यन्त्र भवन प्रवलिकरण अनुगमन प्रतिवेदन

११ तस्वीरहरु:



20/11/21

धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र (वडा ६ १० ३१ र ३२) नामक परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल पुस १८ गतेका दिन बिहान ८:०० बजे काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र (वडा ६ १० ३१ र ३२) नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाउँ लगायत वडा सदस्य श्री हरि बहादुर बस्नेत सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरु र कर्मचारीहरु तथा यस परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र नामक यो परियोजना सडक पिच, ढलान, ढल तथा वाल निर्माण कार्य गरेको पाइयो । गौरव योजनामा पर्ने 'धुलोरहित सडक' नामक कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्ममा ५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको पाइयो । उक्त कार्यका लागि जम्मा ८० करोड २३ लाख ०३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ १९ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । वडाबाट प्राप्त भएका मागका आधारमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, मर्मत गर्ने, कालोपत्रे तथा आवश्यकता आधारमा ढलान गर्ने, ढल मर्मत गर्ने जस्ता काम हुने पाइयो ।

ठेक्का नं. २४-४९-०८०-०८१-NCBW KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि श्री Worldwide-Kohinoor-Ramita JV लाई मिति २०८१ असोज १४ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरू मिति २०८१ असोज १४ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ असार ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ८० करोड २३ लाख ०३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ १९ पैसा लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ७९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ ३ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ३२ करोड १७ लाख ८५ हजार ३ सय रुपैयाँ ७९ पैसा (भ्याट र पिएस समेत) भुक्तानी भैसकेको र यसबाट हालसम्म २३% वित्तीय र ५१.२५ % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । यसको वित्तिय श्रोत भने आन्तरिक आय रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको

धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र (वडा ६ १० ३१ र ३२) नामक परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । पूर्वाधार सुधार गरेर सडकलाई धुलो रहित बनाउने यो कार्यक्रम गौरवको योजना अन्तर्गत बहुवर्षिय परियोजना हो । यो परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धीका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति नागरिकहरुको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरु प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरुमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु


१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री सन्दिप ढकाल र श्री राजु आचार्य निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।



धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्र (वडा ६ १० ३१ र ३२) नामक परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

७ सरोकारवालाको धारण, राय, सुझाव

यो क्षेत्रको करिब ५० मिटर क्षेत्रमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त भई सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य अवरोध भएको हुँदा सो क्षेत्रको विवाद समाधान भएपछि मात्र कालोपत्रे गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुचारु गरिनु पर्ने ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

निर्माण कार्यको गुणस्तरमा सुनिश्चितता कायम गरी विचलित नभइकन कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित विभाग अगाडि बढ्नु पर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्वीरहरू:



विष्णु

धुलो रहित सडक पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत फलफूल बजारमा सडक ढलान गर्ने कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल असोज २७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिबाट Road Construction and Maintenance works at west sector (west 13-16) of KMC Re-notice अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ को फलफूल बजारमा सडक ढलान गर्ने कार्यको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा सार्वजनिक निर्माण र योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाईका विभागीय प्रमुखहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु र प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो । स्थानीयबासी र पैदलयात्रीहरुलाई सडक पेटी लगायत सडकमा निर्माण सामग्री जथाभावी राखिएकोले असहजता भएको साथै निर्माण कार्य निरन्तर सञ्चालन नभएको भन्ने विषयमा महानगरपालिकामा मौखिक रुपमा गुनासो आएकोले उक्त योजना अनुगमन गरिएको हो ।

२ आयोजनाको परिचय

Road Construction and Maintenance works at west sector (west 13-16) of KMC Re-notice अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ फलफूल बजारमा सडक ढलान गरी सर्वसाधारणलाई सहज गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको पाइयो । ठेक्का नं.३९-७०-०८०-०८१-WCBW-KMC को यो ठेक्का मिति २०८२ वैशाख ४ गते कायदिस दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ असार १० गते रहेको र उक्त परियोजना २०८४ वैशाख ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ७४ करोड ९९ लाख ९८ हजार ७ सय ५१ रुपैया २० पैसा (भ्याट कन्टिन्जेन्सी पिएस सहित) को कूल लागत अनुमान भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ६५ करोड ५७ लाख ३१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ ७२ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ५ करोड ७० लाख (मोबिलाइजेसन प्रथम किस्ता) भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । अनुगमनको समयसम्म यस परियोजनाको वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत र भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्बन्धित विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग र सम्बद्ध प्राविधिक कर्मचारीसँग आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत

धुलो रहित सडक पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत फलफूल बजारमा सडक ढलान गर्ने कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन

अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
३. महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग र सम्बन्धित साइट इन्जिनियरले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

नजिकिदै गरेको चाडवाडलाई विचार गरी व्यापार व्यवसायलाई नकरात्मक असर नहुने गरी केही समय कार्य सञ्चालन स्थगित गर्न र चाडवाड सकिए लगत्तै निर्माण कार्यलाई सुचारु गर्न फलफूल व्यवसायी तथा स्थानीयहरुबाट समेत राय सुझाव प्राप्त भएको ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

निर्माण कार्य क्षेत्रमा जथाभावी फालिएको फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि वातावरण व्यवस्थापन विभागसँग योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइले समन्वय गर्ने ।



धुलो रहित सडक पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत फलफूल
बजारमा सडक ढलान गर्ने कार्यको
अनुगमन प्रतिवेदन

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन


१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल पुस ८ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य बहुवर्षिय परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाइँज्यू लगायत समितिका सदस्यहरु, २० नं. वडाका वडाअध्यक्ष श्री राजेन्द्र मानन्धरज्यू तथा सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरु परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को समेत संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजनास्थलमा २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको मन्दिर परिसरका सत्तलहरुको पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको पाइयो । उक्त कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. ३६ करोड १८ लाख १५ हजार २ सय ११ लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । भौगोलिक रूपमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ मा अवस्थित यस मन्दिरमा सो परियोजना अन्तर्गत पुनः निर्माणको कार्य परम्परागत रूपमा भइरहेको पाइयो । यो योजना अन्तर्गत सत्तललगायत संरचनाको निर्माण परम्परागत नेवारी शैलीमा भइरहेको पाइयो भने कुँदिएका बुट्टेदार ढोका, झ्याल, थामको प्रयोग गरिएको पनि पाइयो । पुनःनिर्माण सहजीकरण समितिले मन्दिर परिसरका संरचना पुनरुत्थान गर्ने क्रममा अभिलेखन, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनसहित पुनःनिर्माणको काममा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी पाइयो ।

ठेक्का नं. १९-४३-०८०-८१-NCBW-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि श्री तुल्सी-अम्बुजा जे.भि., भक्तपुरलाई मिति २०८१ असार ०४ गते कायदिस दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त बहुवर्षिय परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ असार १० गते रहेको र उक्त परियोजना २०८४ असार ०३ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । उक्त परियोजना ४३ करोड ३८ लाख ८८ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ २५ पैसा लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ४२ करोड ८१ लाख ४५ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ १३ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि तीन पटक गरी जम्मा रकम १३ करोड ९३ लाख ६० हजार ५ सय ६० रुपैयाँ (भ्याट समेत) भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको मागबमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको विषय अनुगमनको क्रममा जानकारी पाइयो ।



भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । भद्रकाली मन्दिरको पुनःनिर्माण प्रक्रिया सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइयो । पुनःनिर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा सत्तलमा काठ सम्बन्धी काम गर्दा परम्परागत रूपमा काठको काम गर्ने रैथाने सिप भएका व्यक्तिहरूको सुझाव र सहयोग लिई काम गरेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. भद्रकाली मन्दिर पुनः निर्माणको लागि प्रयोग गरिएका काठलाई बाहिरी वातावरणीय असर अर्थात् हावा पानी घामबाट सुरक्षित राख्नका लागि बिटुमिन पेन्टलाई उपयुक्त स्थानमा र लिनसिड तेललाई उचित मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने ।
२. निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै समयमै कार्य सम्पन्न गर्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
३. महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर श्री रविन्द्र रिजाल र इन्जिनियर श्री अनुप राज ढुङ्गानाले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

सत्तलमा काठ सम्बन्धी काम गर्दा परम्परागत रूपमा काठको काम गर्ने रैथाने सिप भएका व्यक्तिहरूको सुझाव र सहयोग लिई काम गर्ने साथै कम्पाउण्ड वाल बनाउँदा सुरक्षा, सुन्दरता, मौलिकता र उपयोग सहजतालाई ध्यान दिने ।



भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

८ अनुगमन पछि दिइएका सुभावहरु

निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नाम थर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्विरहरु



[Handwritten signature]

भद्रकाली मन्दिर परिसर पुनः निर्माण परियोजनाको
अनुगमन प्रतिवेदन



Dong.

Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार सम्बत् २०८२ फागुन २९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park** परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park नामक यो परियोजना वडा नं ५ सानो गौचरणस्थित रहेको छ । रङ्गशाला १८ रोपनी १ आना २ पैसा ३ दान (१२११.५ वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको र यसमा दर्शक क्षमता १ हजार २ सय ६० जनाको हुने कुराको जानकारी अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीबाट पाइयो । उक्त कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. २२ करोड ९६ लाख ६० हजार ९९ रुपैयाँ र ३९ पैसामा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । स्टेडियममा ९६×६२ मिटरको खेल मैदान हुने र मैदानमा आकाशे पानी निकास प्रणालीसहितको कृत्रिम घाँस राखिने गरि यो योजनाको काम अगाडि बढाइएको जानकारी पाइयो भने वरिपरि सीमा पर्खाल समेत निर्माण गरिएको देखियो । यसमा २८ वटा चार पाङ्ग्रे र १७८ वटा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन अट्ने क्षमताको पार्किङस्थल रहने विषयको जानकारी पाइयो । स्टेडियमको भुइँ तलामा महिलाका लागि २३ वटा र पुरुषका लागि १६ वटा शौचालय हुने र पहिलो तलामा महिलाका लागि ७ वटा र पुरुषका लागि ५ वटा शौचालय हुने गरि काम अगाडि बढेको पाइयो ।

ठेक्का नं. २७-५३-०८०-८१-NCBW-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि Shubha Construction Pvt Ltd, Nayabazar लाई मिति २०८१/०७/२५ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ मंसिर १३ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८२ चैत्र ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संज्ञौता भएको देखिन्छ ।

परियोजनाको कुल लागत अनुमान रु. २२ करोड ९६ लाख ६० हजार ९९ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको र १६ करोड ४७ लाख २० हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ३५ पैसा (भ्याट र पिएस बाहेक) को सम्झौता रकममा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संज्ञौता गरेको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि १२ करोड ८१ लाख ६२

Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

हजार २ सय १२ रुपैयाँ ७१ पैसा भुक्तानी भैसकेको र प्रगति हेर्दा वित्तीय प्रगति ६७.८९% र भौतिक प्रगति ७५% भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजनाको काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइयो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. परियोजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

फुटबल रंगशाला निर्माण भएको मैदानमा पानीको पुनर्भरणको लागि रिचार्ज पिटको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै विभिन्न रूपमा परियोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित प्राविधिकले विशेष ध्यान दिने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

१. सबै मौसममा रंगशालाको प्रयोग गर्दा घाम र पानीबाट दर्शकलाई सुरक्षित राख्नको लागि छानाको व्यवस्था र दर्शकदिर्घामा बस्ने ठाँउमा सीटको प्रबन्ध हुनुपर्ने ।
२. रंगशालाको सीमा पर्खालको वरिपरि लगाइएको पर्खालमा जालीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।



Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

१. रंगशालाको भवन अपाङ्गतामैत्री भएको नपाइएकोले भवनलाई अपाङ्गतामैत्री एवं सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउन र्यामका साथै माथिल्लो तलामा जानको लागि कम्तीमा १ वटा हिलचियर अट्ने लिफ्ट बनाउने ।

२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री अर्जुन अर्याल र माया अवस्थीले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी परियोजनाको गुणस्तरियता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु



[Handwritten signature]

Re-Construction of Sanogaucharan football Stadium Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

धुलो रहित सडक निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ चैत्र २७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा धुलो रहित सडक-पूर्वी क्षेत्र (वडा नं. ६-१०, ३१, ३२) अन्तर्गत वडा नं. ३२ मा पर्ने निर्माण कार्यको अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

धुलो रहित सडक बनाउने योजना काठमाडौं महानगरपालिकाको गौरवको योजना हो । काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वच्छ सफा सुन्दर बनाइ बस्न लायक सहरको रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले विशेष प्राथमिकताकासाथ गौरवको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरपालिकालाई विभिन्न क्षेत्रहरुमा विभाजन गरी सबै क्षेत्रलाई समेटी विशेष महत्वका साथ महानगरपालिकाले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दै आएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा महानगरपालिका पूर्वी क्षेत्रका सडकलाई धुलो रहित सडकको रूपमा विकास गर्ने सो योजना अन्तर्गत मुख्य कार्यहरु पिच, ढल, सडक मर्मत, बत्ति, तालिम अदि रहेका छन् । अनुगमन गरिएको मिसिल संलग्न परियोजना धुलो रहित सडक पूर्वी क्षेत्रमा रहेको छ । पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गत महानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं ६, १०, ३१ र ३२ पर्दछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागबाट कार्यान्वयन भई हाल चालु अवस्थामा रहेको धुलो रहित सडक परियोजना ३२ वडा अन्तर्गत रहेको बहुवर्षिय परियोजना हो ।

धुलो रहित सडक कार्यका लागि स्वीकृत लागत ८० करोड २३ लाख ०३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ १९ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको निर्माण व्यवसायीसँग ७९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ३६१ रुपैयाँ ०३ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. २४-४९-०८०-०८१-NCBW-KMC को यो ठेक्का मिति २०८१ असोज १४ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ असोज १४ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ असार ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । यो परियोजना बहुवर्षे भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट २० करोड रहेको पाइयो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति ८०% र वित्तीय प्रगति ७५.६१% भएको देखिन्छ । परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग र सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा वडा कार्यालय, स्थानीयबासी तथा सरोकारवालासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो । उक्त परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा यसअघि २०८२ पौष १८ गते पहिलो पटक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट अनुगमन गरिएकोमा समितिबाट पुनः अनुगमन गरिएको हो

धुलो रहित सडक निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व परियोजनाका बारेमा परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभाग सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा आवश्यकतानुसार अवलोकन विधि, अन्तरसंवाद विधि तथा प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भइ कार्य भएको ।
२. परियोजनामा तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

परियोजना कार्यान्वयन गर्दै गर्दा नरेपाँट तरकारी बजार अगाडि रहेको सडकको करिब ७० मिटर लम्बाई र ११ मिटर चौडाई क्षेत्रफलमा सम्मानीत श्री जिल्ला अदालतको आदेश पश्चात कार्यान्वयन कार्य स्थगन भएकोले उक्त स्थानमा निर्माण कार्य सञ्चालन हुन नसकेको पाइयो ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

यो परियोजना कार्यान्वयन कार्य ठेक्का समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सरोकारवालाको धारणा रहेको पाइयो ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझाव

सम्मानीत श्री जिल्ला अदालतको स्थगन आदेश फुकाव भइ अर्थात अदालतको फैसला अन्तिम भइ आएपश्चात फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विभागलाई परियोजनासँग सम्बन्धित वडा कार्यालय र सरोकारवालाहरुले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनका क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

धुलो रहित सडक निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

११. अनुगमनका क्रममा लिइएका तस्विरहरु:



Signature

धुलो रहित सडक निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन
प्रतिवेदन



Signature

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल चैत ५ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्यक्रम नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजनास्थलमा भवन निर्माण कार्य हुनेछ । उक्त कार्यको लागि कुल लागत अनुमान ३ करोड ३३ लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ रहेको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय, बसन्तपुरमा जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो ।

ठेक्का नं. ०८-१२-०८१-०८२-NCBW-PWD-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि S.B. Construction लाई मिति २०८२ मंसिर २१ गते कायदेशि दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ मंसिर २१ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८३ असोज ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । ३ करोड ३३ लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा २ करोड ११ लाख २३ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ७४ पैसामा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि १८ करोड भुक्तानी भैसकेको र यसबाट हालसम्म १०% वित्तीय र ४० % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धिका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

नागरिकहरूको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरू प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुचि रहेको पाइयो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना परियोजना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. प्रयोग गर्ने सामग्री स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रयोग गर्न अनुमति लिई ल्याब टेस्ट समेत गरी प्रयोग भएको ।

५. अनुगमन क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

प्रस्तुत परियोजना तोकिएको समयमा गुणस्तर कायम गरी सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षको समन्वयात्मक भूमिकामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

परियोजना कार्यको अगाडिको बाटोमा बिच्छ्याइएको ढुंगाको फाइनल फिनिसिङ्ग नभएको र बारुणयन्त्र भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारको क्रममा बिग्रिन गएकोलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्नुपर्ने ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

परियोजना विश्वसम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र भएको हुनाले सो सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण परिपालन गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइ कार्य गर्नुपर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फर्म ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।




जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु

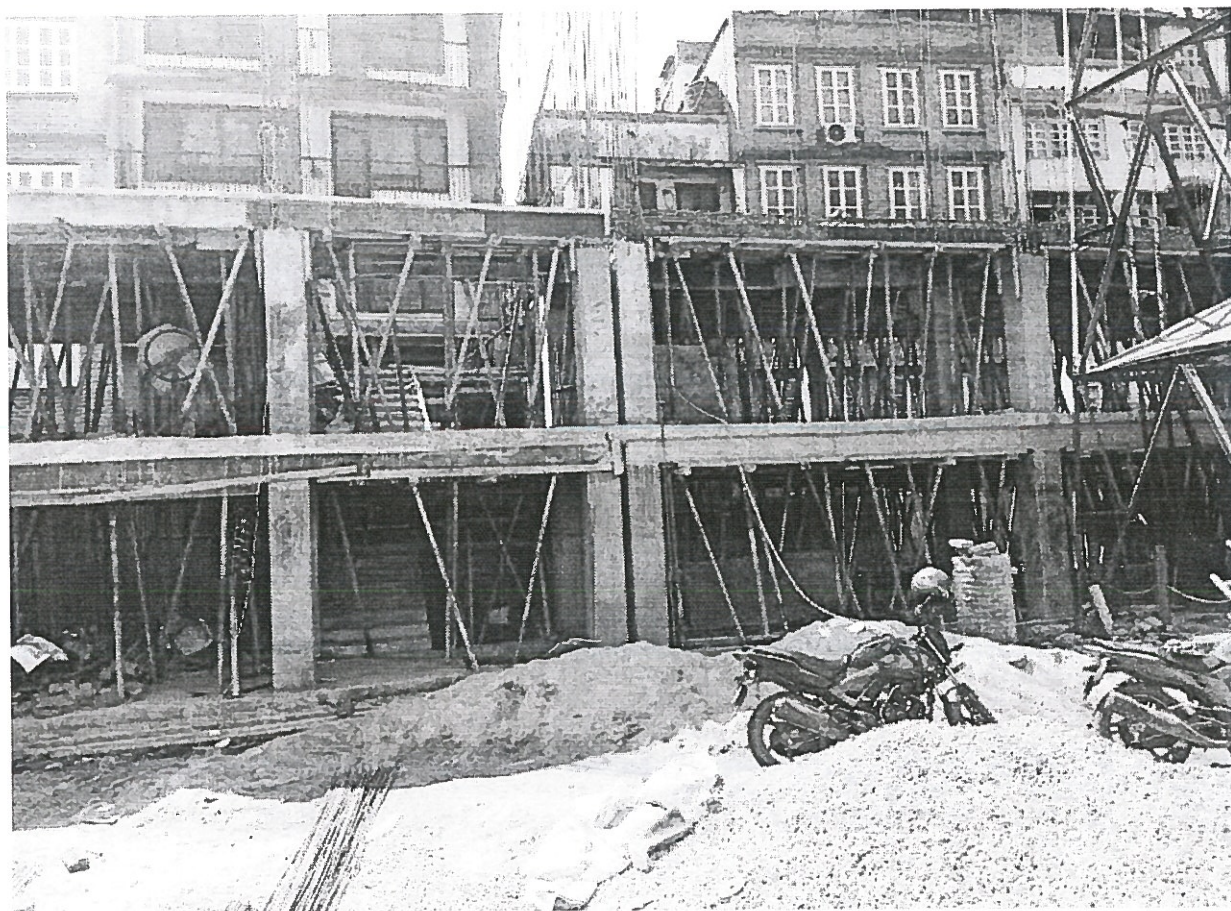

Handwritten signature

जुद्ध बारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्य
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Dr. J. B. Barun

कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल चैत्र ५ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) र सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

राजा जय प्रकाश मल्लका पालामा वि. सं. १८१४ मा यो बहालको रूपमा निर्माण गरिएको कुमारी घरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अन्तर्गतको यस कुमारी घर “कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य” नामक यो परियोजना रहेको छ । यस अन्तर्गत कुमारी घरसँग सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षलाई विशेष ध्यान दिई कार्य अघि बढिरहेको पाइयो । उक्त कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. १ करोड ७ लाख ७ सय ४५ रुपैयाँ ७ पैसा (भ्याट र पिएस बाहेक) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएको पाइयो । जीर्णोद्धार कार्य गर्दा कुमारी घरबाट दैनिक सञ्चालन हुने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्ष, अन्य भौतिक संरचनासँगका छानाको सम्बन्ध र छानो मर्मत गर्दा अन्य संरचनाको बचावका विषयमा सहभागी सरोकारवाला र स्थानीयसँग कुराकानी भयो । निर्माण कार्य गर्दा पूर्व र उत्तरतर्फको छानोलाई पहिले मर्मत गरिने र त्यसपछि मात्र पश्चिम र दक्षिण तर्फको छानो मर्मत गरिने कुरा सम्बन्धित प्राविधिक इन्जिनियरबाट जानकारी भयो । बर्खायाममा कुमारी घरको छानो चुहिने भएपछि जीर्णोद्धारको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन भई काम गरिरहेको पाइयो ।

ठेक्का नं. ०८-१२-०८१-८२-NCBW-PWD-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि श्री अजय निरमान सेवालाई मिति २०८२ फागुन ११ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ फागुन २९ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८३ माघ ३० गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । १ करोड ७ लाख ७ सय ४५ रुपैया ७ पैसा (भ्याट र पिएस बाहेक) कुल लागत अनुमान गरिएकोमा ७१ लाख २४ हजार ६ सय ८९ रुपैया (भ्याट र पिएस बाहेक) सम्झौता भएको देखियो । बहुवर्षे आयोजना अन्तर्गत चालु आ.व.का लागि विनियोजित बजेट भने २ करोड रहेको पाइयो । यस परियोजनाको श्रोत आन्तरिक रहेको र सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री गौरव श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

सत्तलमा काठ सम्बन्धी काम गर्दा परम्परागत रूपमा काठको काम गर्ने रैथाने सीप भएका व्यक्तिहरूको सुझाव र सहयोग लिई काम गर्ने साथै कम्पाउण्ड वाल बनाउँदा सुरक्षा, सुन्दरता, मौलिकता र उपयोग सहजतालाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन भयो ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

- १ छानामा रहेको झिंगटीबाट पानी चुहिने समस्या नआउने गरी विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने ।
- २ वर्षायाम सुरु हुन भन्दा अगाडि नै काम सक्ने गरी काम जनशक्ति बढाएर काम गर्न निर्देशन भयो ।

कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३ कुमारी घरमा प्रयोग भएका काठहरुको मौलिकता र त्यसको सुन्दरता कायम रहने साथै क्षति नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने ।


९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु

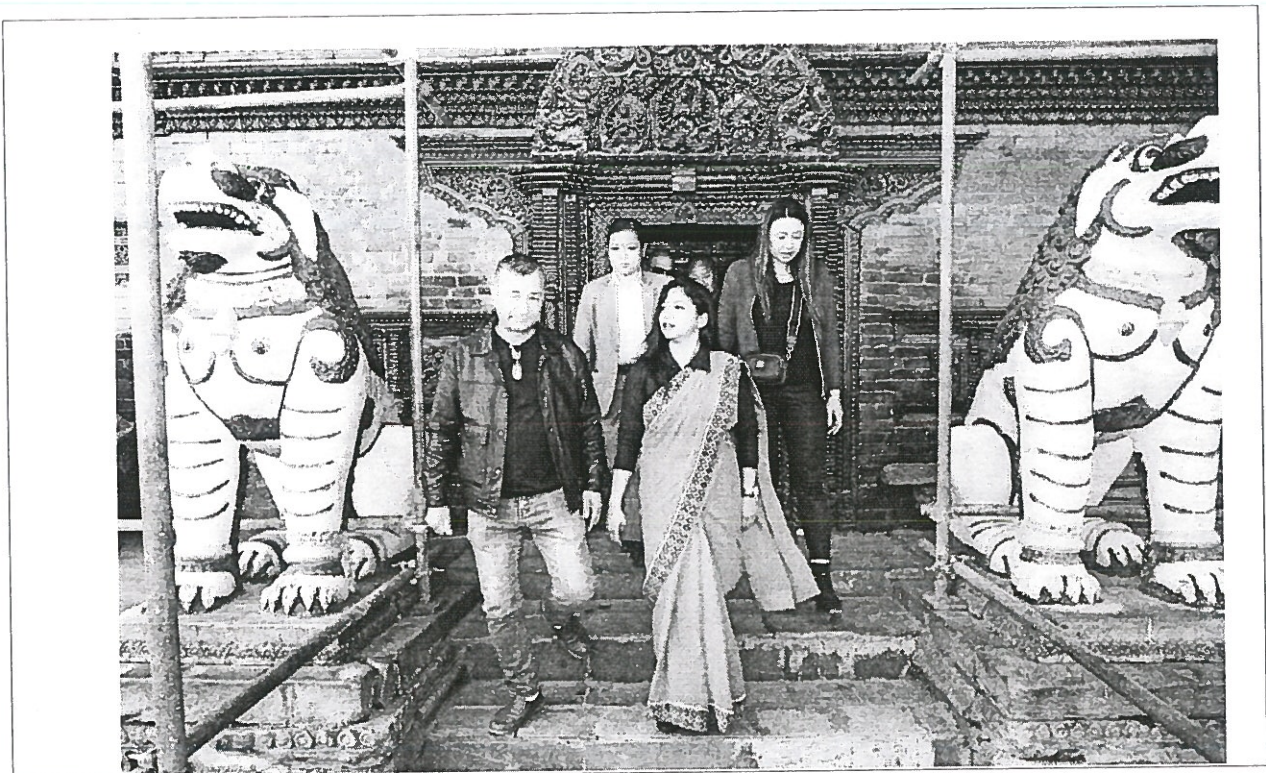

Signature

कुमारी घर जिर्णोद्धार कार्य परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Dr. K.

Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल फागुन ५ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction** नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख सम्बन्धित कर्मचारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction नामक यो परियोजनाका लागि स्वीकृत लागत अनुमान रकम रु. २ करोड ६९ लाख ८७ हजार ९३ रुपैयाँ र ७६ पैसा स्वीकृत लागत (भ्याट र पिएस सहित) को भएता पनि सम्झौता रकम रु. १ करोड ९१ लाख ६६ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ ६४ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो ।

ठेक्का नं. ०३-११-NCBW-०८१-८२-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८१ बैशाख १४ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ बैशाख १४ रहेको र उक्त परियोजना २०८१ फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि सबै सम्झौता रकम रु. १ करोड ९१ लाख ६५ हजार ७ सय ९० रुपैया ६४ पैसा भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । परियोजनाको वित्तिय प्रगति हेर्ने हो भने १००% र भौतिक प्रगति १००% देखिन्छ । उक्त परियोजना सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम भएको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको पाइयो । योजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भएको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सम्पन्न भएको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भएको,

Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य भएको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा सम्बन्धित विभागले परियोजनाको परिमाणात्मक एवं गुणात्मकता सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण व्यवसायीबाट परियोजना हस्तान्तरण गरी लिने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

उक्त परियोजना सम्बद्ध कुनै प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

अनुगमनका क्रममा उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि हाल महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको मा समाजबाट आभार व्यक्त गरी महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको ।

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको कर्मरोङ्ग समाज केन्द्र भवन साँस्कृतिक तथा सामाजिक एकताको प्रतिकको रूपमा बनाइएकोले यस भवनलाई समाजले अधिकतम उपयोग गर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।


१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction परियोजनाको अनुगमन
प्रतिवेदन

११ अनुगमनका क्रममा लिइएका तस्विरहरु

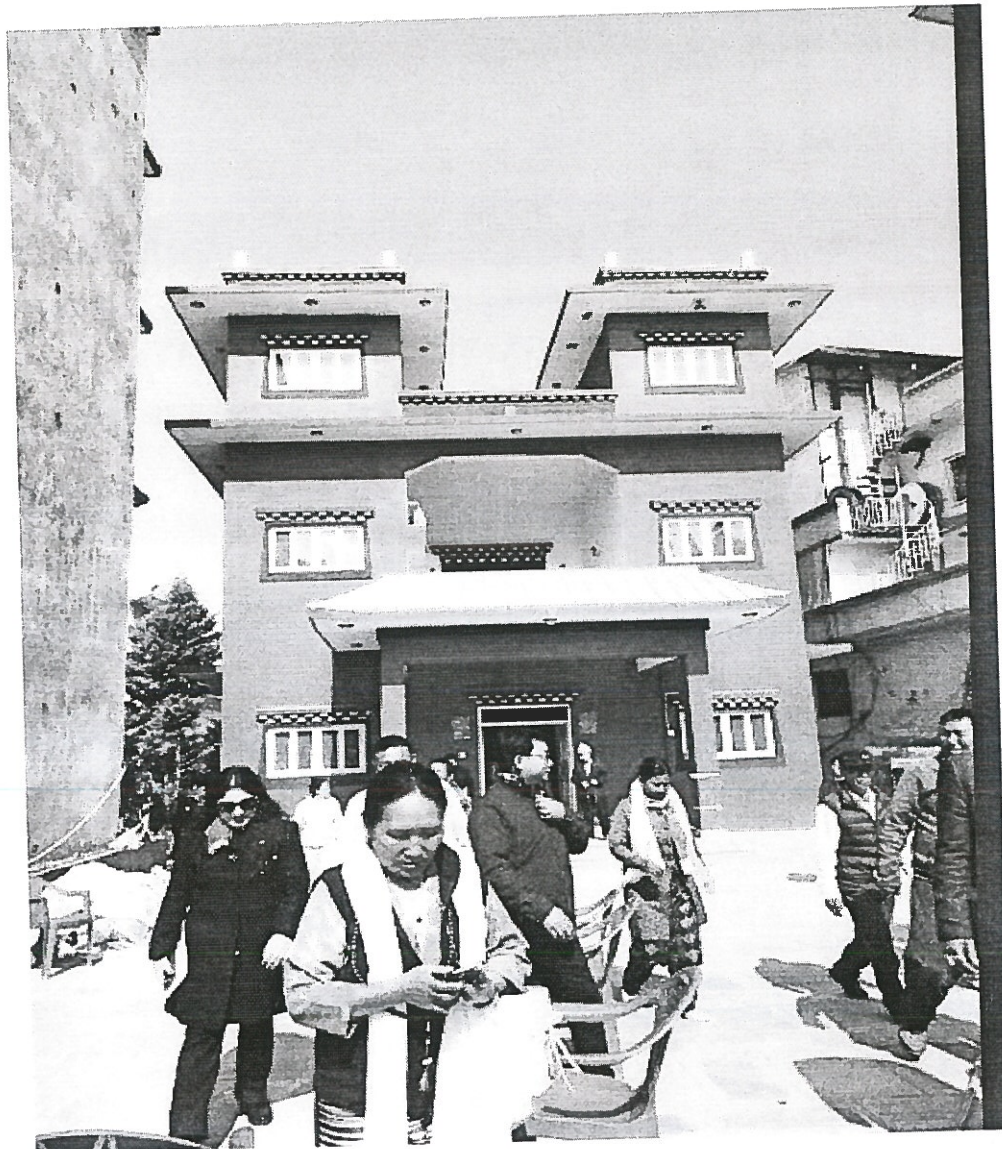

[Handwritten signature]

Karma Rong Bikash Samaj, Building Construction परियोजनाको अनुगमन
प्रतिवेदन



[Handwritten signature]

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल चैत्र १९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Reconstruction of pati near Teku Nawadurga Bhawani Mata** नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १२ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवाला समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड दिई कार्य गर्दै आएको छ । भौतिक रुपमा देखिने मूर्त सम्पदाको साथ साथै अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा पनि महानगरपालिकाको विशेष जोड रहेको छ । मिसिल संलग्न परियोजना महानगरबासीको धार्मिक सांस्कृतिक महत्वसँग जोडिएको परियोजना हो । टेकुस्थित नवदुर्गा भवानी माताको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने दर्शालु भक्तजनहरु माताको दर्शनका लागि लगिएका सामग्री तयारी गर्ने, पानी पर्दा ओत लाग्ने, घाम लाग्दा शितलता लिने र थकान मेटाउने साथै स्थानीयबासीहरु जम्मा हुने, फुर्सदको समय बिताउने र दुःख सुख एकआपसमा साटासाट गर्ने साथै चाडपर्व अनुसार भजन कृतन गर्ने लगायतका कार्यमा यस निर्माणाधिन पाटी उपयोग हुने देखिन्छ । मन्दिर नजिकै रहेकोले यसको बहुउपयोग तथा विशेष महत्व रहने हुन्छ ।

Reconstruction of pati near Teku Nawadurga Bhawani Mata नामक परियोजनाका लागि स्वीकृत लागत २ करोड ३३ लाख ४८ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको पाइयो । ठेक्का नं. 10-11-081-82-NCBW-HTD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८२ माघ १४ गते कायदिसि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२/११/१३ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ कार्तिक २९ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । उक्त परियोजनाका लागि २ करोड ३३ लाख ४८ हजार ३ सय ९५.४३ (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा १ करोड ५० लाख ६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ ५२ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि रकम भुक्तानी नभएको परियोजना सम्बन्धित प्राविधिकबाट जानकारी पाइयो । अनुगमन गरिएको मितिसम्म भौतिक प्रगति ५% देखिन्छ । उक्त परियोजना सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा स्थानीयबासीसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व परियोजनाका बारेमा परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभाग सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा आवश्यकतानुसार अवलोकन विधि, अन्तरसंवाद विधि तथा प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको,
३. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१. सडक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री अव्यवस्थित रूपमा थुपारिएको पाइएकोले फुटपाथ सडकबाट हटाएर व्यवस्थापन गर्ने ।
२. भवन नजिकै रहेको अस्थाई संरचनाले नयाँ बन्ने भवनको सुन्दरतालाई फिक्का बनाउने देखिएको हुँदा उक्त भवनलाई सुन्दरीकरण गर्न के गर्न मिल्छ विचार गर्नुपर्ने ।
३. परियोजना स्थलमा देखिएका पुराना झ्याल, ढोका तथा काठका संरचनाहरूको जथाभावी फाल्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुपर्ने र पुनःप्रयोग हुन सक्ने काठको वर्गीकरण गरी प्रयोग गर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

पाटीको निर्माणले मन्दिर परिसरको सौन्दर्यमा बढोत्तरी हुने भए तापनि सो परिसरमा अवस्थित अन्य संरचनाको सौन्दर्यीकरण समेत परम्परागत ढाँचामा नै गरी सो क्षेत्रलाई सम्पदामैत्री स्थलका रूपमा विकास गरिनुपर्ने ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

१. यस्ता खालका पुरातात्विक महत्वका स्थलको पुनर्निर्माणमा वृहत योजना सहित DPR गरिनुपर्ने ।

२. निर्माण कार्यमा तिब्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने ।



Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

४ तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित विभाग र कर्मचारीले निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने ।


९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको छ ।

११. तस्विरहरु:

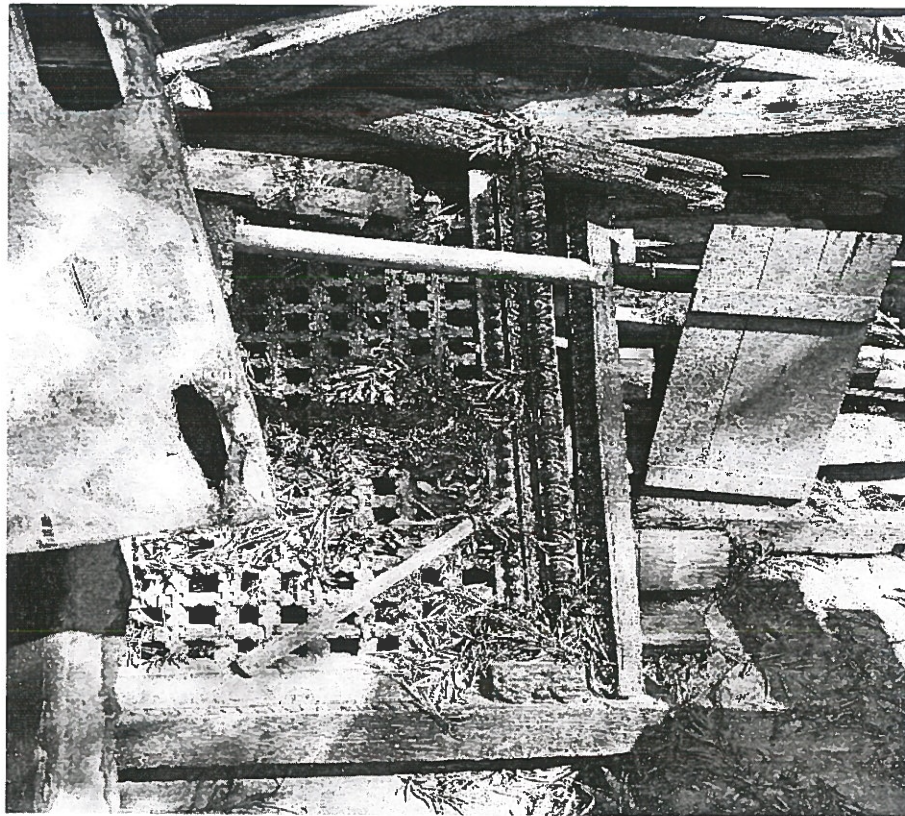

११

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८३ वैशाख १७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा Goma Ganesh Temple Reconstruction Works नामक परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १ नक्सालमा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १ नक्सालस्थित गोमा गणेश मन्दिर निकै पुरानो मन्दिर हो । स्थानीयबासीको भनाइ अनुसार गोमा गणेश मन्दिर कमलादीमा रहेको गणेशस्थान मन्दिर भन्दा पनि पुरानो हो भन्ने स्थानीयबासीको अनुसार जानकारी पाइयो । मन्दिर निकै वर्ष पुरानो भई जीर्ण अवस्थामा पुगेको हुनाले स्थानीयबासीको जानकारी तथा मागलाई मध्येनजर गरी मन्दिरलाई पुर्न भत्काइ गोमा गणेश मन्दिर पुनः निर्माण योजना निर्माण तथा सोको लागि बजेट विनियोजन भइ कार्य भएको जानकारी पाइयो । उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैली र स्वरूपमा गर्ने गरी मन्दिरको Drawing Design भएको पाइयो । पुन निर्माण गर्दा मन्दिरलाई पुर्न जमिनदेखि नै भत्काई सोही शैली र स्वरूपमा पुनर्निर्माणका लागि कार्य सुरु भएको प्राविधिक कर्मचारीबाट जानकारी पाइयो ।

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works नामक यो परियोजनाका लागि कुल लागत अनुमान १ करोड ५८ लाख १ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ ७९ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) रहेको छ । यस परियोजनाको ठेक्का नं. **14-23-081-082-NCBW-HTD-KMC** रहेको पाइयो र हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२/०७/२७ रहेको र उक्त परियोजना २०८३/०७/२६ मा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी २०८२/०७/२७ गते कायदेशि दिएको देखिन्छ । १ करोड ५८ लाख १ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ ७९ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) को कुल लागत अनुमान भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ७५ लाख १९ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ २२ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ६ लाख भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । चालु परियोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति ८% र भौतिक प्रगति १५% देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो । तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification मा हालसम्मको कार्यमा वालको मोटाई दाची बाहेक १८" बाट १४" गरिएको विषयको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीबाट पाइयो । मन्दिरको

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

भित्री भाग सानो हुने भएकाले वालको मोटाई घटाई दाची बाहेक १४" गरिएको, काठको फ्रेम वालमा थप सबलीकरणको लागि थपेर मन्दिर पुन निर्माण कार्य भएको जानकारी पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नुपूर्व परियोजनाका बारेमा सम्बद्ध विभाग सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययनपछि अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरू

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. परियोजना केही समय ढिलो सुरु भए तापनि तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी कार्य प्रगति भइरहेको,
३. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

१ गोमा गणेश मन्दिर पुनः निर्माण कार्य गर्दा पुरानो शैली र स्वरूपलाई विशेष ध्यान दिएर कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने ।

२ मन्दिरमा प्रयोग गर्ने सामग्री तथा काष्ठकलाको गुणस्तरियता सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

निर्माणाधिन गोमा गणेश मन्दिर परिसरमा दर्शनार्थी भक्तजनको उपयोगको लागि पाटी बनाउन महानगरपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरिदिनु भन्ने माग स्थानीय सरोकारवालाबाट भएको पाइयो ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरू

१ हाल चालु अवस्थामा रहेको यस परियोजनाको परिसरमा लगाइएको पर्खालको बाहिर रहेको सडकको फुटपाथमा राखिएका निर्माणका सामग्रीहरू तुरुन्त हटाई फुटपाथ सहज आवागमनको लागि खुला गर्ने र सो विषयको जानकारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीले योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइमा गराउने ।

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

२ पुनर्निर्माण कार्यमा निर्धारित गुणस्तरियता कायम गर्दै तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको छ

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरू :



[Handwritten signature]

Goma Ganesh Temple Reconstruction Works
परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ चैत्र २७ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा "Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC" अन्तर्गत पेप्सीकोला ग्राउण्ड परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना वडा नं ३२ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

"Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC " कार्यका लागि स्वीकृत लागत १० करोड ०५ लाख ३६ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ ९९ पैसा (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको निर्माण पक्ष व्यवसायीसँग ७ करोड ९७ लाख ४० हजार २१८ रुपैयाँ ५७ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. ३८-६९-०८०-०८१-NCBW-KMC को यो ठेक्का बमोजिम कार्य गर्न मिति २०८१/०९/२८ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ पौष २८ रहेको र उक्त परियोजना २०८३ जेठ ३१ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । चालू रहेको यस परियोजनाको लागि हालसम्म भुक्तानी रकम १ करोड ४० लाख भएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति २०% र वित्तीय प्रगति २०% देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग /वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात समेत अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,

२. आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको,

Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC

३. परियोजना कार्यान्वयन तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।
५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष
गुणस्तरीय सामानको उपलब्धतामा भएको ढिलाइले आयोजना सम्पन्न हुन केही बढी समय लागेको भए तापनि अन्य पक्षलाई संवोधन गरी समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निरन्तर अनुगमन र ताकेता गर्नको लागि सार्वजनिक निर्माण विभागले पहल गर्नुपर्ने ।
६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय
त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।
७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव
फुटबल ग्राउण्डले स्थानीयबासीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव हुने हुँदा यो स्थानको उपयोग एवं संरक्षणमा स्थानीयको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
८. अनुगमन पछि दिइएका सुझाव
 - १ फुटबल ग्राउण्डको बहुउपयोग हुने गरी तयारी गर्ने र यसको प्रयोग सोही बमोजिम हुनुपर्ने ।
 - २ फुटबल ग्राउण्डको जमिनमुनिको पानीको सतहलाई पुनरभरण गर्नको लागि पर्याप्त संख्यामा Recharge Pitको प्रबन्ध गरी परियोजनालाई हरेक दृष्टिले वातावरणमैत्री बनाइनु पर्ने ।
९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर
अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।
१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची
अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।
११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु:



Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC



Dr. X.

Installation of Ground Water Recharge System and Artificial Turfing in Different Football fields of KMC



Handwritten signature

Construction of Skateboard Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन


१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल फागुन २९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा "Construction of Skateboard Park" परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा Skatepark निर्माण गर्ने योजनाबमोजिम ठेक्का गर्दा सुरुमा वडा नं १६ भित्र गर्ने गरी ठेक्का भएकोमा त्यहाँ निर्माण गर्ने भनिएको ठाँउको जमिन विवादका कारण वडा नं ३१ मा स्थानान्तरण भएको, उक्त जमिन विपद् प्राधिकरण नेपाल सरकारको जमिन भएको र त्यसमा पार्क निर्माण गर्न नमिल्ने जानकारी प्राप्त भएपश्चात त्यसपछि वडा नं ५ र ७ मा सो पार्क निर्माण गर्न उपयुक्त जमिन खोजी गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको जानकारी परियोजना कार्यान्वयन सम्बद्ध प्राविधिक कर्मचारीबाट पाइयो । वडा नं ५ मा निर्माण गरिने गरी तय भएको स्थानको जमिन पनि निर्माण कार्यको समयमा स्थानीयबासीबाट केही विवाद भई हाल सो समस्या समाधान भई हाल निर्माण कार्य निरन्तर सुचारु भएको जानकारी पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निर्माण गर्न लागिएको Skatepark नेपालमा सरकारीस्तरमा पहिलो पटक बनाइएको हुँदा यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

Skatepark निर्माण कार्यका लागि स्वीकृत लागत ७ करोड ९८ लाख ४३ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित) लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको निर्माण व्यवसायीसँग ६ करोड ७० लाख ९७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ ९५ पैसा (भ्याट र पिएस सहित) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. ३५-१४०-NCBW-०७९-०८०-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८१ जेष्ठ ३२ गते कार्यदिश दिएको पाइयो र उक्त परियोजना २०८२ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति ३५% (लगभग) र वित्तीय प्रगति १०% देखिन्छ । परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य हुनुपर्नेमा डिजाइन केही परिमार्जन गरी कार्य भइरहेको जानकारी सम्बन्धित प्राविधिकबाट पाइयो । परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही समय स्थानीय लाभग्राहीसँग विवाद भएतापनि अनुगमनको समयमा वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीबाट पाइयो ।



Construction of Skateboard Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात समेत अध्ययन गरियो। सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. स्थानान्तरण हुँदै योजना कार्यान्वयन कार्य भएकोले निर्धारित कार्यतालिकामा केही परिवर्तन भएतापनि हाल काम निरन्तर भैरहेको,
३. परियोजनाको कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

परियोजना सम्बद्ध साइट इन्जिनियरले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरियता कायम राख्दै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

यस परियोजना सम्पन्न भए पश्चात परियोजना हस्तान्तरण, सञ्चालन साथै संरक्षण र मर्मत सम्भारका विषयमा महानगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाइ परियोजना सञ्चालनका कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझाव

- १ परियोजना परिसरभित्र निर्माण भएका र हुने संरचना सुरक्षित एवम् बालमैत्री हुनुपर्ने ।
- २ तोकिएको गुणस्तर र निर्धारित समयभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गर्न सम्बन्धित इन्जिनियरले परियोजनाको सुपरीवेक्षण गर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



Construction of Skateboard Park परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

११. तस्विरहरु



Signature

Construction of Skateboard Park

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Handwritten signature

Construction of Single Cell Box Culvert at Bagbazar

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८३ वैशाख ११ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख श्री सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा **Construction of single cell box culvert** परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २८ मा रहेको छ । अनुगमन कार्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु, परियोजना रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित कर्मचारीहरु, महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरु, परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) र सरोकारवाला समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आयोजनाको परिचय

काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी तर्जुमा भएको Construction of single cell box culvert निर्माण परियोजनाको लागि स्वीकृत लागत ९० लाख ४० हजार ५ सय ५० रुपैयाँ ८० पैसा (भ्याट पिएस र कन्टिजेन्सी सहित) मा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएको पाइयो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको निर्माण व्यवसायीसँग ५७ लाख ७२ हजार ६९४ रुपैयाँ ४७ पैसा (भ्याट र पिएस बाहेक) मा सम्झौता भएको पाइयो । ठेक्का नं. ०६-१०-०८०-०८१-NCBW-PWD-KMC को यो ठेक्का मिति २०८२ श्रावण २२ गते कायदेशि दिइएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८२ फागुन १९ रहेको र उक्त परियोजना २०८२ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति १२% र वित्तीय प्रगति १०% देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग /वडा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छलफल भएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३. अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व परियोजनाका बारेमा परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभाग सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरियो । सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा आवश्यकतानुसार अवलोकन विधि, अन्तरसंवाद विधि तथा प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

४. अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. परियोजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम कार्य भइरहेको,
३. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

Construction of Single Cell Box Culvert at Bagbazar

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

परियोजना कार्यान्वयन कार्यलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित विभाग र तोकिएका साइट इन्जिनियरले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक जनशक्ति थप गर्न लगाइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्ने ।

६. विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय

उक्त परियोजना कार्यान्वयनको लागि त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७. सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

Construction of single cell box culvert निर्माण कार्यको प्रारम्भिक चरणमा रातीको समयमा समेत निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने गरिएकोले तहाँ प्रयोग भएका मेसिनरी उपकरणको आवाजका कारण नजिकै बसोबास गरेका स्थानीयबासीलाई असुविधा भएको गुनासो निर्माण पक्षसँग प्राप्त भएकोले हालसम्म कार्यले गति लिन नसकेको भन्ने कुरा स्वयम् सरोकारवालाबाट जानकारीमा आएको र अब निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नको लागि तिव्रताका साथ कार्य गरिनु पर्ने विषय अनुगमनको क्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भएको ।

८. अनुगमन पछि दिइएका सुझाव

परियोजनाको निर्माण कार्यमा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम रहने गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभाग र साइट इन्जिनियरको निगरानी तथा सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले परियोजना निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ कार्य गर्नुपर्ने ।

९. अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



Construction of Single Cell Box Culvert at Bagbazar

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

११. अनुगमनको क्रममा लिइएका तस्विरहरु:



[Handwritten signature]

Construction of Single Cell Box Culvert at Bagbazar

परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

महांकाल मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल पुस ९ गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यूको नेतृत्वमा महांकाल मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाइँज्यू लगायत समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले आस्थापूर्वक पूजा आराधना गर्ने यस महांकाल मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य नामक यो परियोजना अन्तर्गत कालोपत्रे गरेर अग्लिँदै गएको सडक र सत्तल क्षेत्रको जमिन सतह मिलाउने, परिसरमा पानी पुनःभरण प्रणाली राख्ने, काठका चुकुल बलियो बनाउने, थामसँग पर्खाल र अन्य भाग एक ढिक्का बनाउने जस्ता कार्य भईरहेको पाइयो । उक्त कार्यका लागि स्वीकृत लागत रु. १० करोड ३६ लाख ४६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ लागतमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । मन्दिरको पूर्व, उत्तर र दक्षिण भागमा सत्तल र पश्चिमतर्फ पर्खाल अनि कलात्मक प्रवेश द्वार रहेको यस महाकाल मन्दिरमा परम्परागत निर्माण सामग्री र शैली प्रयोग गरी पुनः निर्माणको कार्य अगाडी बढाइएको पाइयो ।

ठेक्का नं. २०-४४-०८०-८१-NCBW-KMC को यो ठेक्का मिति २०८१ असार १९ गते विनायक एस. पी. बोहोरा जे. भी.लाई कायदिस दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८१ असार २३ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८३ असार १९ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । १० करोड ३६ लाख ४६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ स्वीकृत लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भए तापनि प्रतिस्पर्धा गर्दा ८ करोड ९४ लाख ५३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ ३० पैसा (भ्याट र कन्टिन्जेन्सी बाहेक) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको देखियो । अनुगमन गरिएको मितिसम्ममा उक्त परियोजनाका लागि ५ करोड ७४ लाख ६३ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ३० पैसा (भ्याट र पिएस समेत) भुक्तानी भैसकेको देखिन्छ । वित्तिय प्रगति हेर्ने हो भने हालसम्म ५७.१७% र भौतिक प्रगति ७५% देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको जानकारी सहित कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा



महांकाल मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभाग र सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । महांकाल मन्दिरको पुनःनिर्माण प्रक्रिया सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन विना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification मा सामान्य परिवर्तन भई कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर श्री रविन्द्र रिजाल र श्री शरद आचार्य निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारणा, राय, सुझाव

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागले निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



महांकाल मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको अनुगमन प्रतिवेदन

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा - १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

११ तस्विरहरु



Dr. X.

महाकाल मन्दिर पुनः निर्माण परियोजनाको
अनुगमन प्रतिवेदन



Signature

हनुमानढोका ढुङ्गा छापने कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन

१ पृष्ठभूमि

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२ साल साउन २० गतेका दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाउँको नेतृत्वमा हनुमानढोका ढुङ्गा छापने कार्य परियोजनाको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन कार्यमा २३ नं. वडा सदस्य श्री कन्वना नेपाली, सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरु तथा यस परियोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी (इञ्जिनियर) को संलग्नता रहेको थियो ।

२ आयोजनाको परिचय

हनुमानढोका ढुङ्गा छापने कार्य नामक यो परियोजना अन्तर्गत परियोजना स्थलमा ढुङ्गा छापने कार्य हुनेछ । उक्त कार्यका लागि जम्मा १६ करोड ७३ लाख १० हजार २ सय ३८ रुपैया १२ पैसा लागत (भ्याट सहित) मा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पाइयो । यस आयोजना सार्वजनिक निर्माण विभागसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो ।

ठेक्का नं. ३२-१३१-NCBW-०७९-०८०-PWD-KMC को यो ठेक्का कार्यान्वयनका लागि SandarbhiK-Tulsi J.V., नुवाकोटलाई मिति २०८० चैत्र २ गते कायदेशि दिएको पाइयो । हाल चालु अवस्थामा रहेको उक्त परियोजनाको कार्य शुरु मिति २०८० चैत्र ०२ गते रहेको र उक्त परियोजना २०८२ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी संझौता भएको देखिन्छ । १६ करोड ७३ लाख १० हजार २ सय ३८ रुपैया १२ पैसा लागत (भ्याट सहित) को स्वीकृत लागत भएता पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा १६ करोड ७३ लाख १० हजार २ सय ३८ रुपैया १२ पैसा (भ्याट सहित) मा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग संझौता गरिएको । हालसम्म १०% वित्तीय र ५० % भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिम योजना तर्जुमा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि वडा कार्यालय तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा काम जारी रहेको पाइयो ।

३ अनुगमनमा प्रयोग भएका विधि र अनुगमनको सीमा

अनुगमन गर्नु पूर्व योजनाका बारेमा सार्वजनिक निर्माण विभागबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी परियोजना सम्बन्धी कागजात समेत अध्ययन गरियो । कागजात अध्ययन पछि अनुगमन समितिका तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गरियो । परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परियोजनाको सम्भावित उपलब्धीका बारेमा सोधपुछ गरी परियोजनाका प्रति नागरिकहरुको रुची पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्दा उल्लिखित योजनाहरु

हनुमानढोका ढुङ्गा छापने कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन

प्रति सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरुमा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक अभिरुची रहेको पाइयो ।

४ अनुगमनबाट देखिएका सबल पक्षहरु

१. योजना कुनै बाधा अड्चन बिना सञ्चालनमा रहेको,
२. तोकिएको Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नै कार्य भइरहेको,
३. परियोजना तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने गरी स्वीकृत कार्य तालिका बमोजिम नै कार्य प्रगति भइरहेको,
४. कुनै खालको प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम रहेको नपाइएको ।

५ अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्नु पक्षहरु

१. अनुगमनका क्रममा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने कुनै विषय फेला नपरेको हुँदा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समयमै काम सक्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विभागले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गर्ने,
२. महानगरपालिकाका साइट इन्जिनियर श्री अमित बज्राचार्य र श्री गोरव श्रेष्ठले निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने ।

६ विषय विज्ञ वा प्राविधिक विज्ञको थप विशिष्ट राय (आवश्यक भए उल्लेख गर्ने)

त्यस प्रकारको थप विशिष्ट राय (Additional Expert Opinion) आवश्यक देखिएन ।

७ सरोकारवालाको धारण, राय, सुझाव

८ अनुगमन पछि दिइएका सुझावहरु

९ अनुगमन टोलीको नाम र हस्ताक्षर

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।

१० अनुगमनको क्रममा उपस्थितको नाम सूची

अनुगमन फारम ढाँचा – १ को प्रथम पानामा अनुगमनकर्ताको नामथर, पद र हस्ताक्षर रहेको ।



काठमाडौं महानगरपालिका

राजस्व विभाग

काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागबाट शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका ३७ जना इन्टर्न विद्यार्थीहरूलाई राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलनका लागि तपसिल बमोजिमका वडाहरूमा खटाएको विवरण:-

क्र. सं	जम्मा योजना/कार्यक्रम/संस्था को नाम	अनुगमन भएका आयोजना/कार्यक्रम/संस्था को नाम	अनुगमन भएका आयोजना/कार्यक्रम/संस्था को संख्या	कार्यसम्पन्न वडा/क्षेत्र
१	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१०५८	१ वडा
२	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१५११	३ वडा
३	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	५६७	५ वडा
४	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	४०५५	७ वडा
५	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	४१८	८ वडा
६	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	२८१७	९ वडा
७	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१७२४	१० वडा



(Signature)

(Signature)

८	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	६६६	११ वडा
९	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	६३७	१२ वडा
१०	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	९०६	१३ वडा
११	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	८३५	१५ वडा
१२	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	७३८	१६ वडा
१३	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१२५७	१८ वडा
१४	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	५९४	२० वडा
१५	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१६९१	२२ वडा
१६	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	१३०९	२४ वडा
१७	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	२९८३	२६ वडा
१८	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरू	३४५	२७ वडा

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

Handwritten signature

Handwritten signature

१९	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरु	९८३	२८ वडा
२०	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरु	७०८	२९ वडा
२२	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरु	४८५	३० वडा
२३	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरु	९९१	३१ वडा
२४	राजस्व अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका करदाताहरु	२६६३	३२ वडा
जम्मा			२९९४१	

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिका तथा
योजना, अनुगमन तथा
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

[Signature]

[Signature]

वार्षिक बजार अनुगमन प्रतिवेदन (२०८२/८३)

अवधि: श्रावण २०८२ — असार २०८३

निकाय: कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग

१. पृष्ठभूमिका तथा उद्देश्य

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको खाद्य स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । यस आ.व २०८२/८३ को अवधिमा विशेष गरी प्रशोधित पिउने पानी, होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्थाका क्यान्टिन, हस्पतालका क्यान्टिन र मासु पसलहरूमा केन्द्रित रही अनुगमन कार्य सम्पादन गरिएको छ ।


अनुगमनका मुख्य उद्देश्यहरू:

- बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता जाँच गर्ने ।
- म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने ।
- व्यवसायीहरूलाई खाद्य ऐन र स्वच्छताका मापदण्डबारे सचेत गराउने ।
- व्यवसाय दर्ता र कानुनी प्रक्रियाको पालना सुनिश्चित गर्ने ।

२. अनुगमन टोलीको संरचना (Monitoring Team)

सबै अनुगमन कार्यहरू संयुक्त टोलीद्वारा सम्पन्न गरिएका थिए, जसमा मुख्य रूपमा निम्न सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो:

- का.म.पा. प्रतिनिधि: श्री अनिल वस्नेत(फुड टेक्नोलोजिष्ट) र श्री अशोक पराजुली (फुड टेक्नोलोजिष्ट) ।
- DFTQC प्रतिनिधि: श्री सन्जय चौधरी, श्री सरोज पौडेल, श्री खगेन्द्र प्रसाद खतिवडा, श्री बुद्ध बहादुर कुँवर आदि ।


संजोगता थापा मगर
माइक्रोवायोलोजिष्ट
कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग




३. एकीकृत तथ्याङ्क सारांश

पानी जारको अनुगमन गरिएको संख्या	९ स्थान
होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन आदिको अनुगमन गरिएको संख्या	१२७ संस्था
जम्मा अनुगमन गरिएको संख्या	१३६

पानी जारको अनुगमन विवरण

जम्मा अनुगमन गरिएको दिन	९ दिन
अनुगमन भएको पानी जार भ्यानको संख्या:	८९ गाडी
अनुगमनको क्रममा वरामद तथा नष्ट जारको संख्या	६३९ थान



संजोग्ता थापा मगर
माइक्रोवायोलोजिष्ट
कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग

(Signature)

होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन आदिको अनुगमन विवरण

जम्मा अनुगमन गरिएको दिन	५५	
जम्मा अनुगमन गरिएको संख्या	१२७ संस्था	
अनुगमन गरिएको व्यवसायहरु	संख्या	प्रतिशत
• रेस्टुरेन्ट	७९	६२.२ %
• क्यान्टिन	२७	२१.२ %
• होस्टेल	२	१.५ %
• मिठाई	९	७.० %
• मार्ट	२	१.५ %
• पानीपुरी	१	०.७ %
• मासु	४	३.१ %
• व्याँकेट/क्याटेरिंग	३	२.३ %



संजोगता थापा मगर
माइक्रोवायोलोसि
कृषि तथा पशुपुर्वा

(Handwritten signature)




होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन आदिको अनुगमनको क्रममा देखिएका त्रुटीहरूको विवरण

अनुगमनमा देखिएका त्रुटीहरू	संख्या	प्रतिशत
व्यक्तिगत स्वच्छतामा लापरवाही	३९	३०.७ %
दर्ता/नविकरण नभएको निकायहरू	१७	१३.३ %
लेवल नभएको वस्तु	११	८.६ %
सरसफाई तथा स्वच्छतामा कमी गर्ने व्यवसाय	६४	५०.४ %
म्याद नाघिएको वस्तु प्रयोग	१५	११.८ %
मसिजन्य कागजमा विक्री-वितरण गर्ने व्यवसाय	१५	११.८ %
संरचना सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायहरू	२०	१५.७ %
खाद्य योगशील जथाभावी प्रयोग गर्ने	१९	१४.९ %


संजोगता थापा मगर
 माइक्रोवायोलोजि
 कृषि तथा पशुपं

अनुगमनको क्रममा देखिएका त्रुटीहरूको विवरण

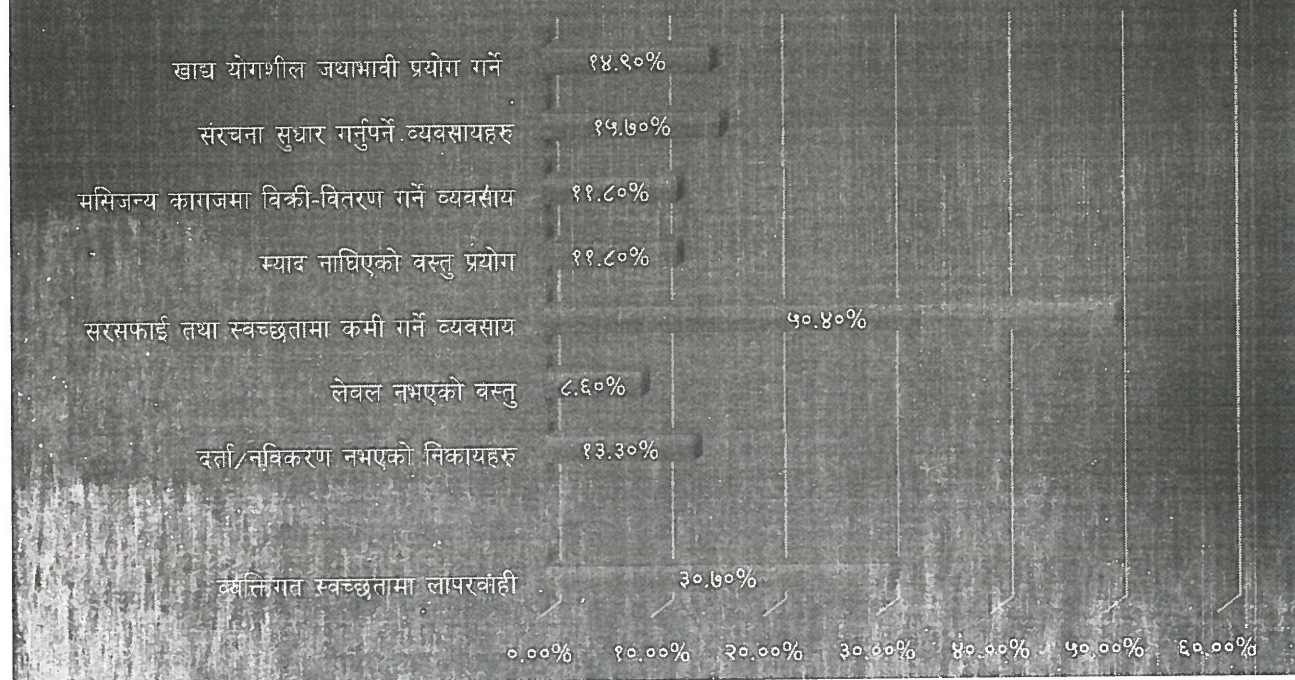

अनुगमनका मुख्य निष्कर्षहरू

मुख्य क्षेत्र	केला परेका साझा समस्याहरू
खान्न योग्यता	कामदारहरूले Hairnet, Mask, Apron र Gloves (PPE) प्रयोग नगर्ने गरेको । भान्सा कोठाको सरसफाईमा धेरै लापरवाही भएको देखिन्छ ।
पिउने पानी	फुटेका र लेउ लागेका जारहरूको प्रयोग
भण्डारण	शाकाहारी र मांसाहारी वस्तुहरू सँगै मिसाएर राख्ने गरिएको
कानुनी अवस्था	धेरैजसो क्यान्टिन र साना रेस्टुरेन्टहरू वडा कार्यालयमा दर्ता नभएको ।
आगो सुरक्षा	Fire Extinguisher नभएको अवस्था रहेको ।
लेबल	लेबल नभएको वस्तुको प्रयोग

यस वार्षिक अवधिमा बजारमा केही सुधार देखिए पनि अझै धेरै व्यवसायहरूले आधारभूत खाद्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । त्यसैले, अनुगमन कार्यलाई अझ प्रभावकारी र नियमित बनाउन आवश्यक छ ।

(Signature)
संजोक्ता थापा मगर
माइक्रोबायोलोजिस्ट
कृषि तथा पशुपक्षी विभाग


(Signature)

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	अनुसूचि क्र.सं.	जम्मा योजना/ कार्यक्रम/ संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका आयोजना/ कार्यक्रम/ संस्थाको नाम	अनुगमन भएका आयोजना/ कार्यक्रम/ संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा/ क्षेत्र	कैफियत
१	अनुसूची ७	७८	गोमा गणेश मन्दिर पुननिर्माण	६९	१	
२			भगवान बहालमा पाटी निर्माण		१	
३			प्राचिन चुनदेवी मन्दिर परिसरमा पाटी र परिसर सुधार कार्य		३	
४			मैतीदेवी छोछे थप निर्माण कार्य		५	
६			नर: बुद्ध विहार पुन:निर्माण		५	
७			राजश्यामाजी (श्री कृष्ण मन्दिर) भवन निर्माण		६	
८			मुगु समाज गुम्बा भवन थप निर्माण		६	
९			परासर गोत्र लामा कार्की समाज गुठी भवन निर्माण कार्य		६	
१०			पाटीटार रुद्रेश्वर शिव मन्दिर पुन:निर्माण		६	
११			देव भय गुठी भवन निर्माण तथा फिनिशिंग कार्य		६	
१२			शेर्पा सेवा केन्द्र		६	
१३			हुम्ला लिमि समाज भवन निर्माण		६	
१४			ओलाङ चुङगोला भवन निर्माण		६	
१५			यमी ग्वायती दिगी द्यो: सत्तल तथा मन्दिर निर्माण		७	
१६			गंगाहिटी हाइट स्थित दिगु ध्यो छें पुन: निर्माण		७	
१७			चाबहिल गणेश स्थान पर्खाल, खट राखे घर जिर्णोद्धार		७	
१८			बनकाली धर्मशाला पुन: निर्माण र परिसर सुधार कार्य		८	
१९			सेतो ढोका निर्माण, नवालीटोल		८	
२०			नित्यनाथ पुन: निर्माण		८	
२१			नयाँ बानेश्वर चोकमा फल्चा निर्माण		१०	
२२			नेपाल कला परिषद परिसरमा भवन निर्माण कार्य		११	
२३			न्हेय्मुन्ट्वा: दुरुगुठी नास: छें		१२	
२४			यूतननी त्वा: खल गुठी घर निर्माण, वडा नं. १२		१२	
२५			दुकुचा खय कुलदेवता पुन: निर्माण कार्य		१२	
२६			पचली भैरव भवय छें निर्माण		१२	
२७			टेकु दोभान स्थित रंजितकारहरुको सत्तल निर्माण		१२	
२८			रुद्र विनायक गणेश मन्दिर पुन निर्माण कार्य		१२	
२९			खड्का गाउँ स्थित भलु भैरव मन्दिर पुरातात्विक शैलीमा पुन: निर्माण		१४	
३०			लक्ष्मी नारायण मन्दिर पुन: निर्माण तथा परिसर सुधार कार्य		१४	

काठमाडौं महानगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
कमलादी, काठमाडौं
बागमती प्रदेश, नेपाल

३१		किमदोल स्थित पेलमा तामांग समाजको देवीथान भवन निर्माण	१५	
३२		स्वयम्भू परिक्रमा (गः चाः) मार्गको सौन्दर्यकरण तथा मन्दिर मर्मत सुधार कार्य	१५	
३३		बौद्ध मार्गहरूको दाहसंस्कार स्थल (चिहान परिसर) मा भौतिक संरचनाहरू निर्माण तथा जिर्णोद्धार कार्य	१५	
३४		गौरी शंकर मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य	१६	
३५		गुम्बा किरियापुत्री रहने स्थानमा क्रियापुत्रीको ढिकुरो, नुहाउने स्थान निर्माण कार्य	१६	
३६		कुमारी स्थान माछापोकरी कुमारी मन्दिर निर्माण कार्य	१६	
३७		जालपा देवी मन्दिर स्तोत्रती कार्य	१६	
३८		नासः घोः छे पुनःनिर्माण कार्य	१७	
३९		कन्या मन्दिर मा.वि. परिसरको इखा पोखरी परिसर विकाश	१७	
४०		इन्द्रायणी क्रियापुत्री भवनमा टूस निर्माण कार्य	१७	
४१		संघाराम विहारमा विभिन्न निर्माण कार्य, वडा नं. १७	१७	
४२		चपा छे (नरदेवी नाच घर) पुनः निर्माण	१८	
४३		देवी नाच दि प्यांख थप पुन निर्माण	१८	
४४		कंग अजिमा तध गुठि छे थप पुनः निर्माण	१९	
४५		कंकेश्वरी मन्दिर परिसरमा चिहान र क्रियापुत्री भवन निर्माण, पाटी जिर्णोद्धार तथा अन्य निर्माण कार्य	१९	
४६		कंकेश्वरी मन्दिर परिसरको पाटीहरूमा डाछी अप्पा तथा कलात्मक काठका झ्याल राख्ने कार्य	१९	
४७		नासः घोः लगन पुनःनिर्माण	२१	
४८		वन्त बहाल थप पुनः निर्माण	२१	
४९		रण मुक्तेस्वोर मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य	२२	
५०		वटु गुंगुचा मन्दिर पुनःनिर्माण, वडा नं. २२	२२	
५१		महाँकाल मन्दिर पुनःनिर्माण	२२	
५२		दैसाः पुनःनिर्माण, वडा नं. २३	२३	
५३		नव आदर्श विध्यालयको जीर्ण भवन भत्काउने कार्य	२३	
५४		देव ब्राह्मण राजोपाध्या आगन्छे पुन निर्माण	२४	
५५		करुणापुर महाविहार मुस्याबहाः पुनःनिर्माण	२५	
५६		केल आचाजु गुथि आगँछे जिर्णोद्धार	२५	
५७		रत्नकेतु महाविहार इवाःबहालको महाबली गुठी आगन घर थप पुनः निर्माण	२५	
५८		हाकु बहालको आगँछे पुनः निर्माण	२५	
५९		ज्वालामाई मन्दिर पुनः निर्माण	२५	
६०		शान्तिपुर मन्दिर छाना मर्मत कार्य	२५	
६१		महेपी अजिमा घो छे पुनःनिर्माण दोस्रो	२७	



(Signature)

६२			भूकुटीमण्डप बौद्ध विहार थप निर्माण अनुदान		२८	
६३			मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा तला थप तथा सौन्दर्यकरण कार्य		३०	
६४			मैतीदेवी मन्दिर सुधार तथा पुर्व उत्तरमा रहेको मयुर कुण्ड पुनःनिर्माण		३०	
६५			पारसनाथ, आनन्दभैरव मन्दिर जिर्णोद्धार कार्य		३०	
६६			मनोहरा पार्कमा सत्तल निर्माण		३२	
६७			श्री कृष्ण मन्दिर निर्माण, नरेफाँट		३२	
६८			वज्रयान विहार लुम्बिनी परिसर सुधार तथा सौन्दर्यकरण कार्यको लागि अनुदान			
६९			अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणी संघलाई लुम्बिनीमा फल्चा निर्माणका लागि अनुदान			
७०			विभिन्न स्थानमा परम्परागत फल्चा निर्माण कार्य			
१	अनुसूची १३	२९	महायान प्रकाश पल्युल धर्मालयको गुम्बा भवनमा थप निर्माण कार्य	१३	६	
२			चावहिल गणेश स्थानमा गेट तथा अन्य निर्माण कार्य		७	
३			वनकाली धर्मशालाको पर्खाल र परिसर सुधार		८	
४			ह्यूमत डचङ्ग नारायण मन्दिर पुनर्निर्माण / जिर्णोद्धार		१२	
५			वडा नं १३ नीलबाराही मन्दिर परिसरको सत्तल निर्माण कार्य		१३	
६			मेहर सि गुठी छें थप निर्माण कार्य		१९	
७			गौरी शंकर मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य		२०	
८			धर्मकार महाविहारमा रहेको क्वा पा छो छें थप निर्माण कार्य		२१	
९			केलटोल स्थित ना. स छो छें पुनः निर्माण कार्य		२५	
१०			मैतीदेवी मन्दिर परिसर सुधार तथा सौन्दर्यकरण कार्य		३०	
११			सम्पदामैत्री भवन निर्माण र संरक्षण अनुदान			
१२			ब्रम्हकुमारी राजयोगको नगरकोटमा भवन निर्माण अनुदान			
१३			अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणी संघलाई लुम्बिनीमा फल्चा निर्माणका लागि अनुदान			
१	गौरव क्रमागत	५३	विभिन्न परम्परागत फल्चा निर्माण	४८		
२			कृष्ण मन्दिर देखि भव कुँ त्वासम्मका घरका अगाडिको मोहडा परम्परागत शैलीमा पुनः निर्माण		५	
३			कुलेश्वर आवासस्थित कुमारी मन्दिर परिसर सुधार इनार मर्मत		१४	
४			लखतिर्थमा विभिन्न पुर्वाधार निर्माण कार्य		१५	
५			शितलामाई मन्दिर भजन मण्डल निर्माण तथा परिसर सुधार		१६	
६			किलाघ देविनाच दी प्यानख छो छें थप निर्माण		१८	

७		भिन्नि वडा हरुको घरको मुलढोका अगाडी पिखालाखु राखे कार्य			
८		सेतोढोका देखि जयबागेस्वरी सम्मको अगाडिको मोहडा परम्परागत शैलीमा पुनः निर्माण		८	
९		ब्रम्हा मन्दिर निर्माण		८	
१०		भद्रकाली मन्दिर परिसरमा भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्ने कार्य		११	
११		किमडोल स्थित बौद्ध शिक्षा भवन निर्माण		१५	
१२		भुईँखेल सत्तल पुनः निर्माण		१५	
१३		इन्द्रायणी परिसरमा गुरु योजना बमोजिम निर्माण कार्य		१७	
१४		वाक बज्र छे र यतमा छे निर्माण कार्य, क्वा वहाल,		१७	
१५		इटुम्बहाल संग्रहालय विकाश कार्य		२४	
१६		कोटेश्वर महादेवस्थान बुद्ध बिहार र परिसर फिनिशिंग कार्य		३२	
१७		फल्चा (बस स्टान्ड) निर्माण			
१८		हिटीपोखरी स्थित पाटि पुनर्निर्माण कार्य		१	
१९		सोर्हा हिटि निकासी सम्बन्धि निर्माण कार्य		१	
२०		वडा नं.०१ अन्तर्गत गैरीधारा लगायत अन्य ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य		१	
२१		रानीबारी स्थित ढुंगेधारा निर्माण		३	
२२		बसुन्धारा कुण्ड पुनर्निर्माण		३	
२३		रानीबारी सामुदायिक वन भित्रको हिटी पुनर्निर्माण		३	
२४		धौ वङ्गल हिटी		३	
२५		चण्डोल स्थित ढुंगेधारा निर्माण		४	
२६		वडा नं.०४ अन्तर्गत सुकेधारा लगायत अन्य ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य		४	
२७		वडा नं.०५ अन्तर्गत ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य		५	
२८		गहनापोखरी पुनर्निर्माण		५	
२९		हाँडी गाउँ ढुंगेधारा		५	
३०		चाबाहिल गणेश ढुंगेधारा		७	
३१		वडा नं. ७ स्थित उत्खनन भएको ढुंगेधाराहरु बनाउने कार्य		७	
३२		लाम पोखरीमा थप पूर्वाधार निर्माण कार्य		७	
३३		गंगा हिति र गणेश हिति मर्मत		७	
३४		CAN पछाडिको ढुंगेधारा निर्माण कार्य		९	
३५		वडा नं. ०९ नैरित्य ढुंगेधारा र ओमनगरको ढुंगेधारा		९	
३६		वडा नं.१० अन्तर्गत ढुंगेधारा बनाउने कार्य		१०	
३७		सेतोपुल अगाडिको ढुंगेधारा पुनर्निर्माण		१०	
३८		वडा नं.१० अन्तर्गत ढुंगेधारा बनाउने कार्य		१०	
३९		चागहिटी पुनर्निर्माण		१३	

४०			वडा १६ अन्तर्गत बालाजु, वनस्थली, जनजागृति लगायत अन्य धुन्गेधरा हरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापन कार्य			
४१			वडा नं. १९ अन्तर्गत दुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य		१९	
४२			गा: हिटी निर्माण		२६	
४३			कपुरधारा दुङ्गेधारा मर्मत		२६	
४४			वडा २६ अन्तर्गत नारायण मन्दिर लैनचौर, पखालाती मार्ग दुंगेधारा निर्माण		२६	
४५			वडा ३० अन्तर्गत दुङ्गेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापन कार्य		३०	
४६			जडिबुटी चोक वाटिका नजिक दुंगेधारा निर्माण		३२	
४७			वडा नं. ३२ स्थित दुंगेधाराहरु बनाउने कार्य		३२	
४८			का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु अन्तर्गत दुंगेधाराहरुको स्रोत तथा निकास सम्बन्धि कार्य			
१	गौरव	६२	लखतिर्थमा विभिन्न पुर्वाधार निर्माण कार्य	३२	१५	
२			भद्रकाली मन्दिर परिसरमा भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्ने कार्य		११	
३			भुईँखेल सत्तल पुनः निर्माण		१५	
४			इन्द्रायणी परिसरमा गुरु योजना वमोजिम निर्माण कार्य		१७	
५			नउ देगः(भवानी शंकर मन्दिर) पुनःनिर्माण कार्य		२५	
६			वडा नं. ४ स्थित संखपार्क परिसर भित्रको शिव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य		४	
७			धर्मशाला अगाडी नित्य-क्रिया स्थान (ढिकुरो) निर्माण		६	
८			किमडोल स्थित बौद्ध शिक्षा भवन निर्माण फिनिसिंग कार्य		१५	
९			बालाजु पार्कमा रहेका विभिन्न मन्दिर हरुको पुन निर्माण कार्य		१६	
१०			बालाजु हाइट बोहोराटारमा रहेको गणेश मन्दिर मर्मत सम्भार		१६	
११			शितला स्कूलमा रहेको रहेको सत्यधर शिव मन्दिरमा निर्माण कार्य		१६	
१२			बालाजु पुल नजिकै रहेको गुरु नानक मठ तथा परिसरमा भौतिक निर्माण कार्य		१६	
१३			वनस्थली स्थित भुवनेश्वर मन्दिरमा भौतिक निर्माण कार्य		१६	
१४			तब्ब भिन्ध्यो त्वा गुठि घर थप निर्माण		२०	
१५			नरेफाटगणेश मन्दिर संगै दुंगेधारा तथा फल्चा सहित परिसर निर्माण कार्य		३२	
१६			धारापाटी स्थित कुवा पुनः निर्माण तथा कुवा परिसर सुधार कार्य		३	



Handwritten signature

१७			वाँसवारी स्थित जलदुङ्गा मार्गमा रहेको कुवा पुन निर्माण कार्य		३	
१८			का.म.पा.३ वडामा रहेको अन्य कुवा तथा ढुङ्गेधारा मर्मत तथा पुन निर्माण कार्य		३	
१९			वडा नं ४ स्थित विभिन्न कुवा,इनार तथा पानीको स्रोतहरु मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण		४	
२०			गहनापोखरी पुनर्निर्माण		५	
२१			ज्ञानमति धारा मर्मत र मुहान संरक्षण कार्य		६	
२२			वडा नं ७ कार्यलयको पश्चिममा ढुङ्गेधारा निर्माण		७	
२३			बांकोट ढुङ्गेधारा निर्माण परिसर सुधार		७	
२४			सरकारी धारा मैजुबहल पुन निर्माण		७	
२५			कालिमाटी डोल अन्तर्गत तीनधारा गल्लीमा रहेको ढुङ्गेधारा परिसर सुधार		९	
२६			के.एम.सी. अस्पताल अगाडी रहेको कुवा र ढुङ्गेधारा मर्मत		९	
२७			रातोपुल संगै रहेको ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा मर्मत तथा परिसर सुधार		९	
२८			टौडोलमा रहेको ऐतिहासिक इनार मर्मत सम्भार कार्य		१६	
२९			का.म.पा.१६ मा रहेको विभिन्न हिटी कुवा इनार मर्मत मर्मत सम्भार कार्य		१६	
३०			बोहोराटारमा रहेका इनार, कुवा, र ङ्गेधाराहरुको पुन निर्माण कार्य		१६	
३१			का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु अन्तर्गत ढुङ्गेधारा र पोखरीहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य			
३२			जडी बुटी सिमको धारा पुनर्निर्माण		३२	
१	मुख्य	३	पञ्चायन मन्दिर तथा मन्दिर परिसर पुन निर्माण	२	११	
२			पूर्णचण्डी कूलदेवता मन्दिर तथा सत्तल पुन निर्माण		७	



 नेपाल सरकार
 काठमाडौं महानगरपालिका
 कार्यपालिकाको कार्यालय
 बागमती प्रदेश, नेपाल
 २०७३

जम्मा योजना / कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको नाम	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा/क्षेत्र
६४	अन्य विविध खर्च		
	टेकु दोभानमा पार्क निर्माणकार्य		१२
	Indoor Plant खरिद गर्ने कार्य		का.म.पा. कार्यालय
	आइल्याण्ड मर्मत तथा दुबो छाप्ने कार्य		विभिन्न वडा
	पश्चिम क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		१३, १४, १५, १६, १७
	भण्डारखाल पार्क (यः पुखु) निर्माण कार्य ८ वडा		८
	धन गणेश मन्दिरपार्क निर्माण कार्य		५
	पार्क संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य		विभिन्न वडा
			११, १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७,
	मध्य क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य	५४	२८, २९
	बालकुमारी देखी कोटेश्वर रोडको पर्खाल सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य		३२
	Tactical Urbanisum Works (corner Garden)		विभिन्न वडा
			१, २, ३, ४, ५, ६, २६, ३१
	उत्तर क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		
	संखुमल पार्क निर्माण खण्ड २		१०
	ट्रि गार्ड मर्मत तथा रंगरोगन गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	स्पोर्ट्स पार्क निर्माण कार्य १० वडा		१०
	स्मार्ट बत्ति जडान कार्य (Smart Lighting Works at Parks)		विभिन्न पार्क
	बालाजु बाइस धारागा रंगरोगन गर्ने कार्य		१६
	मौसमी फूल खरिद गर्ने कार्य बालाजु शंखधर शंखपार्क शभा गृह		का.म.पा. कार्यालय

(Signature)

जम्मा योजना / कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको नाम	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा/क्षेत्र
६४	इको पार्क निर्माण कार्य	५४	३
	नयाँ पार्क निर्माण गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	बुद्धनगर पार्क निर्माण कार्य		१०
	भोटेबहाल महिला कारागारअगाडी पार्क निर्माण कार्य		१२
	पश्चिम क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		१३, १४, १५, १६, १७
	फल्चा र पार्क निर्माण धोबीखोलाखहरे दोभान वार्ड ५		५
	बोहराटार पार्क निर्माण गर्ने कार्य		१६
	Beautification and maintenance of Purana Park		विभिन्न वडा
	पुराना पार्क मर्मत तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	वृक्षारोपण कार्यका लागि रुखबिरुवा, आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	Beautification of Balkhu Park		१४
	मध्य क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		११, १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, २९
	Bridge Beautification Works at Riverside		विभिन्न वडा
	श्री नवग्रह यन्त्र जलकुण्ड निर्माण		रत्नपार्क
	धन गणेश मन्दिरपार्क निर्माण कार्य		५
	पूर्व क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिस्वाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		६, ७, ८, ९, १०, ३१
	भण्डारखाल पार्क (यः पुखु) निर्माण कार्य ८ वडा		८
	पुराना पार्क मर्मत तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	बालाजु बाइस धारामा मा रहेको स्विमिंगपुल संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च		१६

[Handwritten signature and initials]



जम्मा योजना / कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको नाम	अनुगमन भएका कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा/क्षेत्र
६४	Balaju Construction and Maintenance Works	५४	१६
	वृक्षारोपण कार्यका लागि रुखबिरुवा खरिद गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	संखुमुल पार्क निर्माण खण्ड २		१०
	स्पोर्ट्स पार्क निर्माण कार्य १०वडा		१०
	ट्रि गार्ड खरिद गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	फल्चा र पार्क निर्माण धोबीखोलाखहरे दोभान वार्ड ५		५
	भित्री सहर क्षेत्रमा गमला सहित बिरुवा खरिद गर्ने कार्य		विभिन्न वडा
	पूर्व क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिरुवाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		६,७,८,९,१०,३१
	उधानहरुमा मौरीको गुँड घर निर्माण		विभिन्न वडा
	उत्तर क्षेत्रका पार्क तथा अन्य शहरी बिरुवाहरु संरक्षण गर्ने कार्य		१,२,३,४,५,२६,३०
	Shankhamul Park		१०
	Supply and plantation of Urban Plants (upto 5 ft)		विभिन्न वडा
	पार्क संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य		विभिन्न वडा
	बालाजु बाइस धारामा मा रहेको स्विमिंगपुल परिसर सुधार तथा निर्माण कार्य		१६
	वृक्षारोपण र पार्क व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन		विभिन्न वडा
	आइल्याण्ड मर्मत गर्ने कार्य		विभिन्न वडा

Handwritten signature and initials.

आ.व. २०८२/०८३ मा समाजिक विकास विभाग मार्फत भएका अनुगमनको विवरणः

क्र.सं.	जम्मा योजना/कार्यक्रम/संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका आयोजना/कार्यक्रम/संस्थाको नाम	अनुगमन भएका आयोजना/ कार्यक्रम/ संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा/क्षेत्र	कैफियत
१.	४६	अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ/संस्थासंग सहकार्य तथा ती संघसंस्था मार्फत का.म.पा सहयोगमा भएका कार्यक्रम र अनुदान कार्यक्रम	४६	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	
२.	६	जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ/संस्थासंग सहकार्य तथा ती संघसंस्था मार्फत का.म.पा सहयोगमा भएका कार्यक्रम	६	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	
३.	७	यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ/संस्थासंग सहकार्य तथा ती संघसंस्था मार्फत का.म.पा सहयोगमा भएका कार्यक्रम	७	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	

कोठमाडौं महानगरपालिका
सामाजिक विकास विभाग
कोठमाडौं प्लाजा, कमलजल
२०७३

(सुमन शर्मा)

सुमन


४.	१२	खेलकुदका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संघ/संस्थासंग सहकार्य तथा ती संघसंस्था मार्फत का.म.पा. सहयोगमा भएका कार्यक्रम र अनुदान कार्यक्रम	१२	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	
५.	१७	विभिन्न संघसंस्था सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन	१७	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	
६.	९	बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ/संस्थाहरुको अनुगमन	९	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु।	
७.	५१	संघसंस्था नविकरण सिफारिस प्रयोजनका लागि गरिएको अनुगमन	५१	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु	

सामाजिक विकास विभागबाट भएको कुल अनुगमन संख्या:- १४८



(Signature)

समिक्षा निरौला
विभागीय प्रमुख
सामाजिक विकास विभाग




काठमाडौं महानगरपालिका

स्वास्थ्य विभाग

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०८३/०८४

चलानी नं: २५१३२४

मिति: २०८३/०६/०६

ने.स.११४६ ब्रंलाथ्य एकादशी

विषय: अनुगमन विवरण सम्बन्धमा।

श्री योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन एकाई,
काठमाडौं महानगरपालिका।

प्रस्तुत विषयमा त्यस विभागको मिति २०८३/०५/२५ गतेको च.न.२५ वमोजिम यस विभागमा रहेको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा स्तरोन्नती सम्बन्धि कार्यविधिले व्यवस्था गरेको अनुगमन तथा सिफारिस समितिबाट भएको अनुगमन, विषयगत समिति बाट भएको अनुगमनमा विभागमा भएको आ.व.०८२/०८३ को अनुगमन विवरण तपशिल वमोजिमको रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।

तपशिल:

क्र.स.	अनुगमन भएको आयोजना/ कार्यक्रम/संस्थाको नाम	संख्या	वडा/क्षेत्र	कैफियत
१.	स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा स्तरोन्नती समिति	६१	१ दखि ३२ वार्ड	काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु
२.	आर.आर.टी.(महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण)	३२	१ दखि ३२ वार्ड	विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुबाट अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको।
३.	विभागिय प्रमुख स्तरबाट भएको अनुगमन	२९	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र	१५,२० र २९ मा बाहेक अन्य संस्थामा अनुगमन भएको
४.	महाशाखा प्रमुख स्तरबाट भएको अनुगमन	३१	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र	२२ मा बाहेक अन्य संस्थामा अनुगमन भएको

२०८३/६/६

२०८३/६/६


(दिपक कुमार के.सी.)
विभागीय प्रमुख

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, नेपाल। फोन नं: ०१४१६८७२९

इमेल: health.dept@kathmandu.gov.np, info@kathmandu.gov.np, वेबसाइट: www.kathmandu.gov.np

**काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी बिभागबाट आ.व. २०८२।०८३ मा
सहकारी अनुगमन गरीएका सहकारीहरु**

क्र.सं.	जम्मा सहकारी संस्थाको संख्या	अनुगमन भएका सहकारी संस्थाको नाम	अनुगमन भएका सहकारी संस्थाको संख्या	कार्य सम्पन्न वडा	कैफियत
१.	१९०९	विभुति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड	४०	२२	
२.		क्याराभान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बसुन्धारा		३	
३.		पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था लि., पुशुपति		८	
४.		अन्न लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., हाडीगाउँ		५	
५.		धान्याचल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बनस्थली		१६	
६.		यलुङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बौद्र		६	
७.		माउण्ट मिसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.		२९	
८.		कोटीनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.		३२	
९.		श्रमज्योती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बागबजार		२८	
१०.		पर्यटन समाज सहकारी संस्था लिमिटेड, ठमेल क्षेत्रपाटी		१६	
११.		इलम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., धोवीधारा पुतलीसडक		२८	
१२.		प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मिनभवन		३१	
१३.		गंगबु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सामाखुशी		२६	
१४.		राष्ट्रिय बाणीज्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कालोपुल		३०	
१५.		पिपल वृक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नयाँ बानेश्वर		३१	
१६.		अनुभवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सामाखुसी		२६	

१७.	हाम्रो कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., स्वयम्भु	१५	
१८.	हाम्रो आत्मनिर्भर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पुतलीसडक	२९	
१९.	बालाजी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नयाँ बानेश्वर	३१	
२०.	नव कोटेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कोटेश्वर	३२	
२१.	टिहमचन टहोमफोवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुन्धारा	११	
२२.	बृहद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	१०	
२३.	कोम्हेन्दो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बुद्धनगर	१०	
२४.	चमत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नयाँ बानेश्वर	१०	
२५.	परम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	२५	
२६.	खसड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नयाँ बानेश्वर	१०	
२७.	गीताञ्जली महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., महाराजगञ्ज	४	
२८.	पल्पसा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुन्धारा	२२	
२९.	वात्सल्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	७	
३०.	रिपब्लिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., न्यूरोड	२३	
३१.	ग्रोम्याक्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,	२२	
३२.	उकेरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सामाखुसी	२६	
३३.	श्रीया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मध्यबानेश्वर	१०	
३४.	स्पर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डल्लु	१५	
३५.	बल्लु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बल्लु	१४	
३६.	स्मार्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., फलफुल चोक	१६	

३७.	स्मार्ट ट्रष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., त्रिदेवी मार्ग	२९	
३८.	सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कालीमाटी	१३	
३९.	सिंह बाहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पाको न्यूरोड	२२	
४०.	जनआस्था बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि., हनुमानस्थान	११	




अनुगमन फारम ढाँचा - १

(काठमाडौं महानगरपालिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिद्वारा अनुगमन गर्दा प्रयोग गरिने फारम)

अनुगमन गरिएको आयोजना/कार्यक्रमको नाम:

अनुगमन गरिएको मिति: २०८२/...../.....

योजना/कार्यक्रमको मुख्य कार्य (पीच, ढल, सडक मर्मत, सडक वत्ति, तालीम आदि):

योजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय:

योजना/कार्यक्रमको स्वीकृत लागत (रु.):

योजना/कार्यक्रमको किसिम (स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा अन्य):

आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्थान (खुलेको भए):

निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता/सेवा प्रदायक/साझेदार संस्थाको नाम, ठेगाना:

सम्पर्क नं.:

(क) उपस्थिति:

क्र. सं.	नामथर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
१	उपप्रमुख श्री सुनिता डंगोल	संयोजक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
२	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज गुरागाई	सदस्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
३	वडाध्यक्ष श्री राजेन्द्र मानन्धर, वडा नं. २०	सदस्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
४	वडा सदस्य श्री कन्चना नेपाली हरिचन, वडा नं. २३	सदस्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
४	विभागीय प्रमुख, श्री सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
५	विभागीय प्रमुख, श्री कानून तथा मानव अधिकार विभाग	सदस्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
६	एकाई प्रमुख श्री योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाई	सदस्य-सचिव, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति		
७				
८				
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				
१९				
२०				

(हस्ताक्षर)



(ख) अनुगमनका क्रममा देखिएको योजना तथा कार्यक्रमको वस्तुगत अवस्था		
१	ठेक्का नं. (ठेक्का लगाएको भए)	
२	कार्यादेश मिति	
३	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था (सुरु, चालू, सम्पन्न)	
४	कार्य सुरु भएको मिति	
५	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	
६	सम्पन्न भइ सकेको भए सो को मिति	
७	योजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान	
८	योजना/कार्यक्रमको सम्झौता रकम	
९	सम्पन्न भएको भए बिल रकम	
१०	निर्माणाधीन/चालू भए हालसम्म भुक्तानी रकम	
११	बहुवर्षे आयोजना/योजना/कार्यक्रम अन्तर्गतको भए चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट रु.	
१२	हालसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१३	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	
१४	लाभान्वितको संख्या (खुल्ने भए)	
१५	वित्तीय स्रोत (लागत सहभागितामा भए सो को अनुपात)	
१६	आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग (वडा जनप्रतिनिधिको) रोहबरमा छलफल भए/नभएको :	
१७	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम भए/नभएको	
१८	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नभएको भए सो को कारण	
१९	प्रयोग गर्ने सामग्री Specification अनुसार भए/नभएको तथा सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति लिए/नलिएको	
२०	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए/नभएको	



२१	कार्यतालिका अनुसार काम नभएको भए अनुगमनका क्रममा नयाँ कार्यतालिका बनाउन आदेश दिने/नदिने	
२२	कार्यतालिका अनुसार काम नभएको भए सो को कारण	
२३	प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम भए/नभएको :	
२४	साइट इन्जिनियर/जिम्मेवार कर्मचारीको नाम :	
२५	गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भनी तोकिएको निर्माण कार्य र सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण भए/नभएको, भएको भए सोको विवरण र नभएको भए सोको कारण :	क) नभएको ☐ आंशिक भएको ☐ पूरा भएको ☐ ख) परीक्षण भएको भए सो को नतिजा: ग) परीक्षण नभएको भए सो को कारण:
२६	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपित उपलब्धी र प्राप्त प्रतिफल (जस्तै : बाटो पीच, बगैचा, शौचालय र स्कूल भवन र सो बाट प्राप्त हुने लाभ)	क) प्रक्षेपित उपलब्धी: ख) प्राप्त प्रतिफल:
२७	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोखिम रहेको भए सोको विवरण र न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय	क) जोखिमको विवरण: ख) जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय:
२८	लाभ-लागत विश्लेषण गरिएको भए सो को विवरण	
२९	Defect liability period उल्लेख भए/नभएको र उल्लेख भएको भए सो अनुसार हुने कुराको सुनिश्चितता भए/नभएको	

(ग) योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजताका लागि सुझाव (आवश्यक भएमा):

१.
२.
३.

(घ) बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा कुनै सुधार गर्नु पर्ने विषय पत्ता लागेको भए उल्लेख गर्नुहोस्:

१.
२.
३.



अनुगमन फारम ढाँचा - २

(काठमाडौं महानगरपालिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ को दफा ४ (ट) बमोजिम गठित अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन गर्दा प्रयोग गरिने फारम)

अनुगमन गरिएको योजना/कार्यक्रमको नाम:

अनुगमन गरिएको मिति: २०८३/...../.....

योजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय:

योजना/कार्यक्रमको स्वीकृत लागत (रु.):

योजना/कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्थान (खुलेको भए):

योजना/कार्यक्रमको किसिम (जस्तै: ढल, बाटो पीच, तालीम आदि):

निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता/सेवा प्रदायक/साझेदार संस्थाको नाम, ठेगाना:

मुख्य व्यक्तिको नामथर, पद, सम्पर्क नं.:

(क) उपस्थिति

क्र. सं.	नाम, थर, कार्यस्थान	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
१	श्री	संयोजक, अनुगमन टोली		
२	श्री	सदस्य, अनुगमन टोली		
३	श्री	सदस्य, अनुगमन टोली		
४	श्री	सदस्य, अनुगमन टोली		
४	श्री	सदस्य, अनुगमन टोली		
५	श्री	सदस्य-सचिव, अनुगमन टोली		
६				
७				
८				
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				
१९				
२०				

(Handwritten signature)



(ख) अनुगमनका क्रममा देखिएको योजना तथा कार्यक्रमको वस्तुगत अवस्था		
१	ठेक्का नं. (ठेक्का लगाएको भए)	
२	कार्यादेश मिति	
३	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था (सुरु, चालू, सम्पन्न)	
४	कार्य सुरु भएको मिति	
५	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	
६	सम्पन्न भइ सकेको भए सो को मिति	
७	योजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान	
८	योजना/कार्यक्रमको सम्भौता रकम	
९	सम्पन्न भएको भए बिल रकम	
१०	निर्माणाधीन/चालू भए हालसम्म भुक्तानी रकम	
११	बहुवर्षे आयोजना/योजना/कार्यक्रम अन्तर्गतको भए चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट रु.	
१२	हालसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१३	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	
१४	लाभान्वितको संख्या (खुल्ने भए)	
१५	वित्तीय स्रोत (लागत सहभागितामा भए सो को अनुपात)	
१६	आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय लाभग्राहीसँग (बडा जनप्रतिनिधिको) रोहबरमा छलफल भए/नभएको :	
१७	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम भए/नभएको	
१८	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन Drawing, Design, Bill of Quantity, Specification बमोजिम नभएको भए सो को कारण	
१९	प्रयोग गर्ने सामग्री Specification अनुसार भए/नभएको तथा सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति लिए/नलिएको	
२०	योजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए/नभएको	
२१	कार्यतालिका अनुसार काम नभएको भए अनुगमनका क्रममा नयाँ कार्यतालिका बनाउन आदेश दिने/नदिने	

[Handwritten signature]

२२	कार्यतालिका अनुसार काम नभएको भए सो को कारण	
२३	प्राविधिक/वातावरणीय/सामाजिक जोखिम भए/नभएको :	
२४	साइट इन्जिनियर/जिम्मेवार कर्मचारीको नाम :	
२५	गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भनी तोकिएको निर्माण कार्य र सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण भए/नभएको, भएको भए सोको विवरण र नभएको भए सोको कारण :	क) नभएको ☐ आंशिक भएको ☐ पूरा भएको ☐ ख) परीक्षण भएको भए सो को नतिजा: ग) परीक्षण नभएको भए सो को कारण:
२६	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपित उपलब्धी र प्राप्त प्रतिफल (जस्तै बाटो पीच, बगैचा, शौचालय र स्कूल भवन र सो बाट प्राप्त हुने लाभ)	क) प्रक्षेपित उपलब्धी: ख) प्राप्त प्रतिफल:
२७	योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोखिम रहेको भए सोको विवरण र न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय	क) जोखिमको विवरण: ख) जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय:
२८	लाभ-लागत विश्लेषण गरिएको भए सो को विवरण	
२९	Defect liability period उल्लेख भए/नभएको र उल्लेख भएको भए सो अनुसार हुने कुराको सुनिश्चितता भए/नभएको	

(ख) योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजताका लागि सुझाव (आवश्यक भएमा):

१.
२.
३.

(ग) बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा कुनै सुधार गर्नु पर्ने विषय पत्ता लागेको भए उल्लेख गर्नुहोस्:

१.
२.
३.

(Signature)
